

Project West

情報システム・施策番号：2


EDIシステム統合 プロジェクト計画書

2026年5月19日

買い物を楽しく、暮らしを豊かに。

TRIAL ■ **SEIYU**

STAND TOGETHER



目次

1	背景・目的・ゴール	P.3
2	概要・アプローチ	P.4-11
3	スコープ	P.12
4	EDI登録工数軽減	P.13
5	スケジュール	P.14
6	コスト	P.15
7	体制・役割	P.16-17
8	会議体	P.18
9	課題・リスク	P.19
10	直近アクションアイテム	P.20

1. 背景・目的・ゴール

背景

EDIサービスの違い

- 現在、西友はお取引先への発注データ交換（EDI）基盤は富士通JapanのEDIサービス「Trade Front」を利用している
- トライアルはSCSK社とインテック社のEDIサービスを利用している
- このままでは、システムコストは2重になる

お取引先


- お取引先は、マスタ・MD基幹システムが統合される中、このままでは、西友・トライアルの発注データを別々のEDIサービスで受信することになる
- 先行して惣菜EDIはトライアルと同様のSCSK社のEDIサービス（スマクラforWeb）へ2026年9月に切り替える

EDIシステム統合プロジェクト

- 2027年4月にトライアルとEDI基盤を共通化することにより、運用統一・コスト軽減を図る
- 非惣菜取引先約1360社（生鮮WEB約260社、流通BMS最大1100社）のEDI切替
- トレサビ・西友プロキュアメント・ファームバンキングのデータ連携の切替
- EDI取引先窓口を用意し、取引先各社のスケジュール管理・問い合わせ対応を行ない、期日までのテスト完了推進
- 前提条件として下記①～③が前提となる。
 - ①仕入先コードは9桁コードに拡張するため、トライアルEDI側のコード拡張が必要（トライアル取引先への影響あり）
 - ②商品マスタ統合（2027年3月リリース）により取引先へは商品階層の統一が周知されている
 - ③値札データ連携はせず、トライアルの運用（発注データをもとに取引先は値札作成）へ変更（商品マスタ統合PJ案件）

2. 概要・アプローチ AS-ISフロー

- 発注関連のEDIデータ交換以外にも既存システムからのデータ連携をTradeFront経由で行なっている。

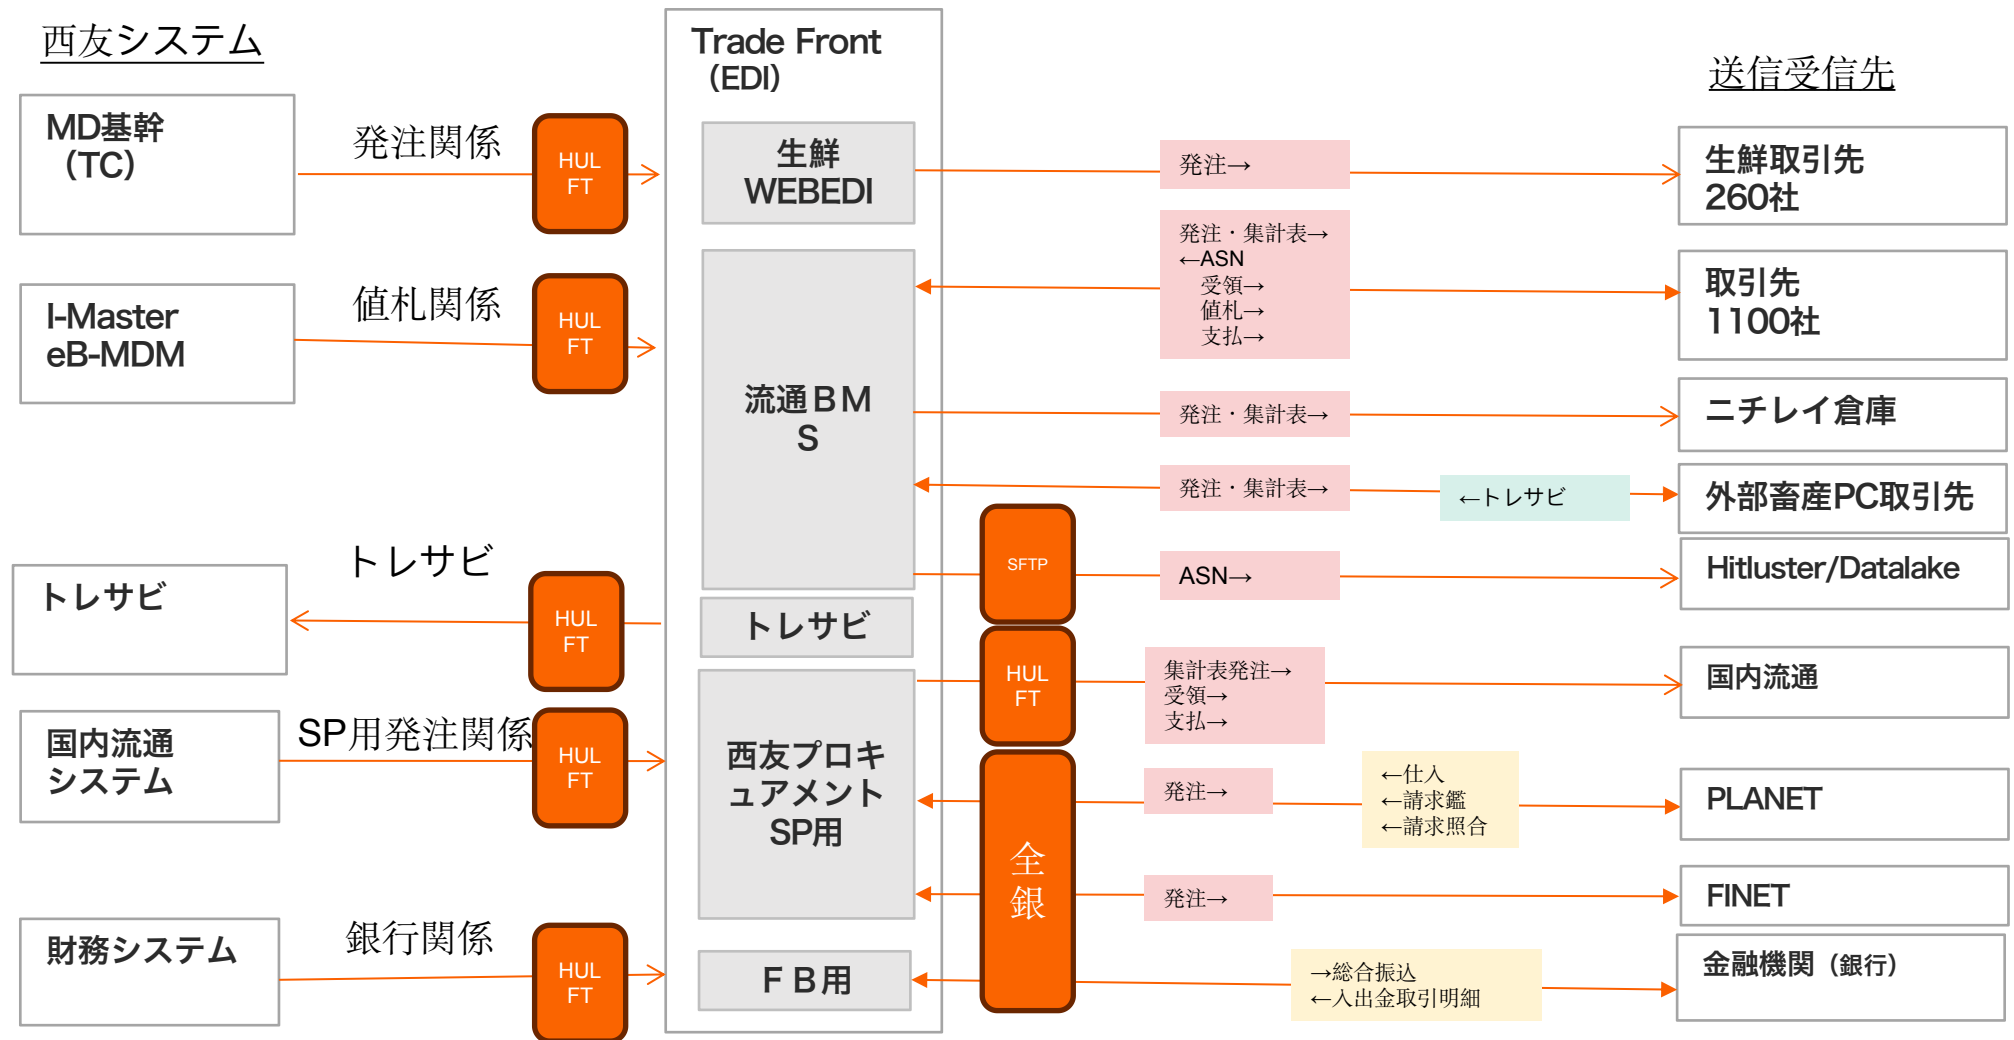


2. 概要・アプローチ To-Beフロー（案1：SCSK/インテック）

- ▶ トライアル同様にWEB EDIはスマクラ、流通BMSはインテックで統合する
- ▶ 西友特殊のトレサビ・西友プロキュアメント・ファームバンキングについては、SCSK/インテックの両社で検討

設定追加のみ

新規開発

※値札についてはトライアル運用では発注データをもとにラベル作成をされる運用のため、運用統合想定

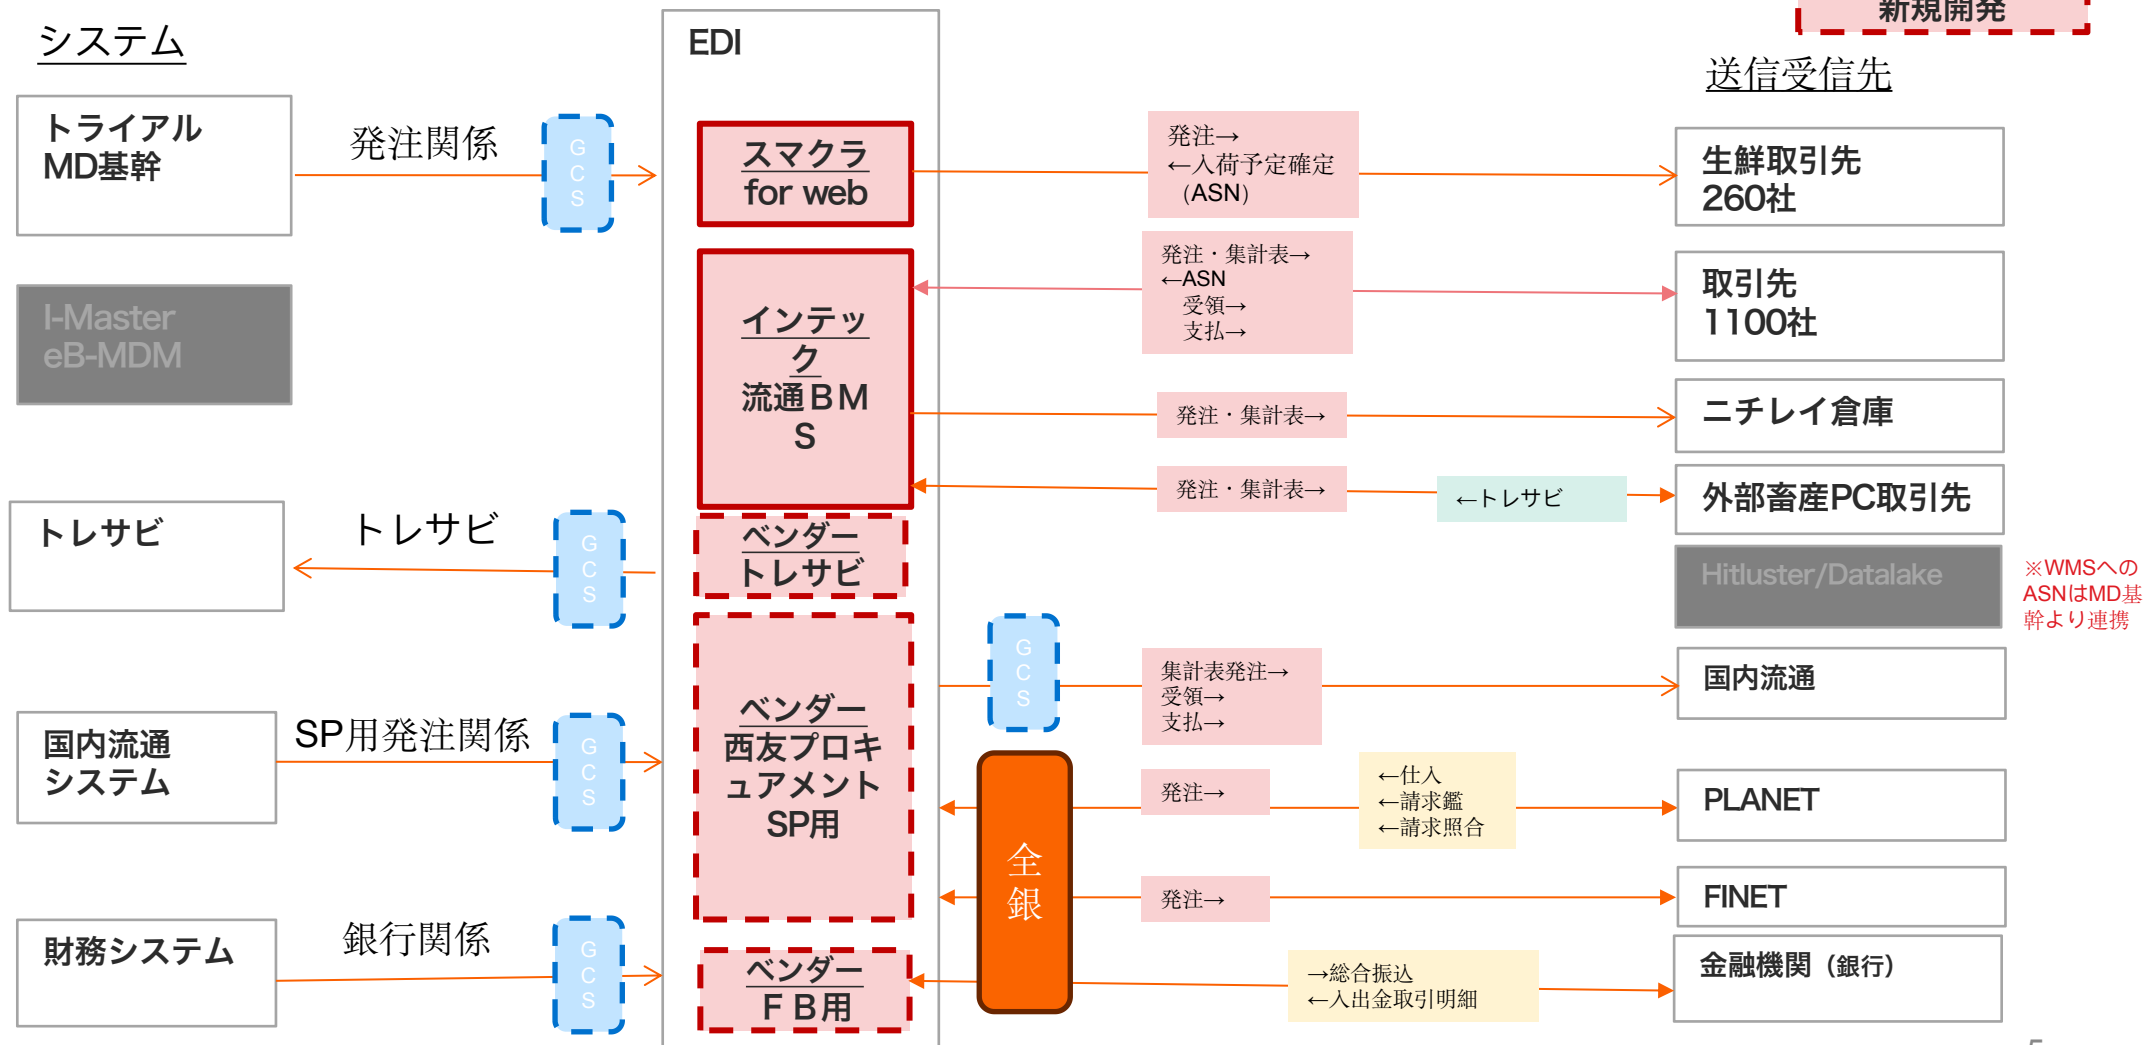

2. 概要・アプローチ To-Beフロー（案2：SCSK/インテック/内製）

- ▶ トライアル同様にWEB EDIはスマクラ、流通BMSはインテックで統合する
- ▶ 西友特殊のトレサビ・西友プロキュアメント・ファームバンキングについては、内製（TRE）で検討

設定追加のみ

新規開発

システム

トライアル
MD基幹

発注関係

GCS

I-Master
eB-MDM

トレサビ

トレサビ

GCS

国内流通
システム

SP用発注関係

GCS

財務システム

銀行関係

GCS

EDI

スマクラ
for web

インテック
流通BMS

ベンダー
トレサビ

内製
西友プロキュアメント
SP用

内製
FB用

発注→
←入荷予定確定
(ASN)

発注・集計表→
←ASN
受領→
支払→

発注・集計表→

発注・集計表→

←トレサビ

集計表発注→
受領→
支払→

発注→

発注→

→総合振込
←入出金取引明細

送信受信先

生鮮取引先
260社

取引先
1100社

ニチレイ倉庫

外部畜産PC取引先

Hitluster/Datalake

国内流通

PLANET

FINET



金融機関（銀行）

※WMSへの
ASNはMD基
幹より連携

全銀

2. 惣菜EDI切替（2026年10月）※別プロジェクトにて実施

- 惣菜システムプロジェクトにて、先行して惣菜EDIはスマクラ（スマクラforweb）へ切替完了

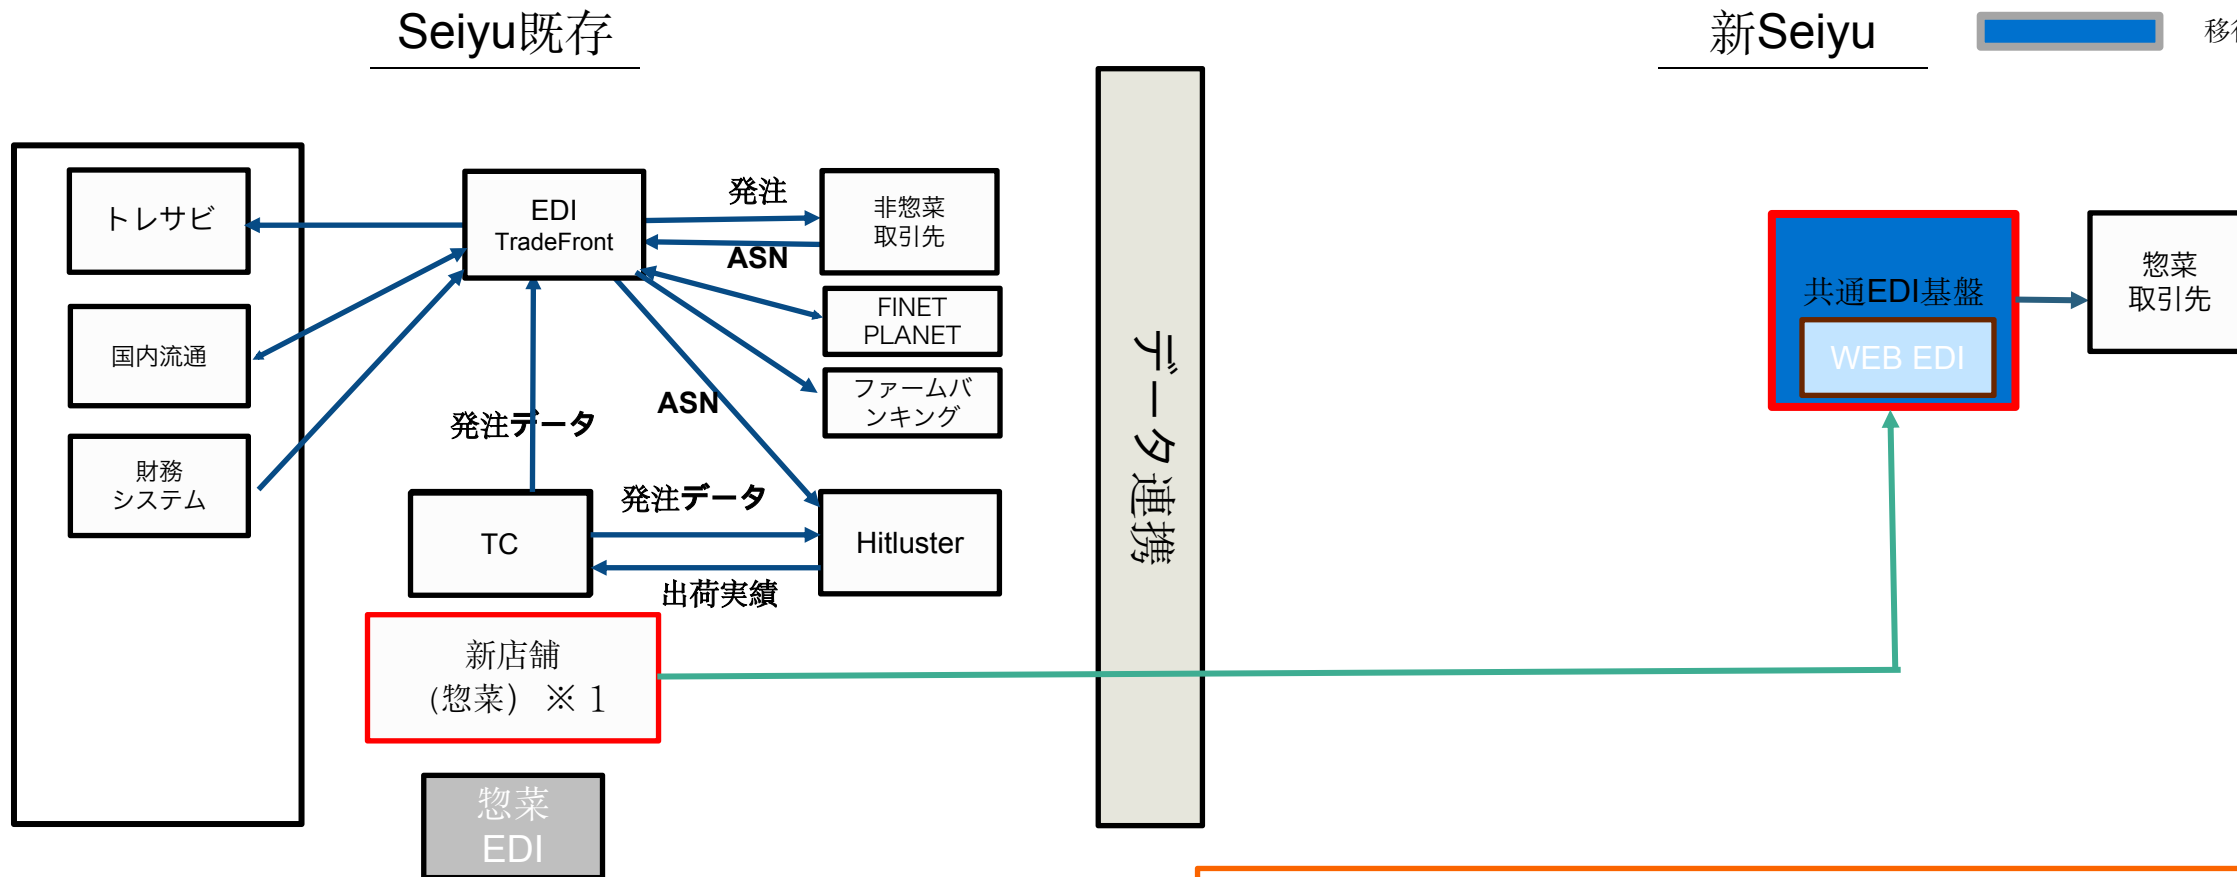

<Memo>


2026年9月末の惣菜CKシステム統合のタイミングで、同時にEDI統合を行う(TREDI環境へ移行)

・西友惣菜取引先は、新規に仕入先コードをTR仕様（4桁コード）に合わせて登録

・新店舗システム→スマクラfor webへ連携(※1)

2. 非惣菜EDI切替（2027年4月）EDI基盤/フォーマット統合

- トライアルのE D I 基盤へ切替を順次行なう。ただし、発注データ元は西友M D 基幹（T C）。
- 取引先は、トライアル・西友で同じフォーマット形式で受信を開始する
- 約1360社の取引先切替のため、発注日を起点に一斉切替となるが、2027年3月末までに設定・疎通テストを完了させる（P.13）

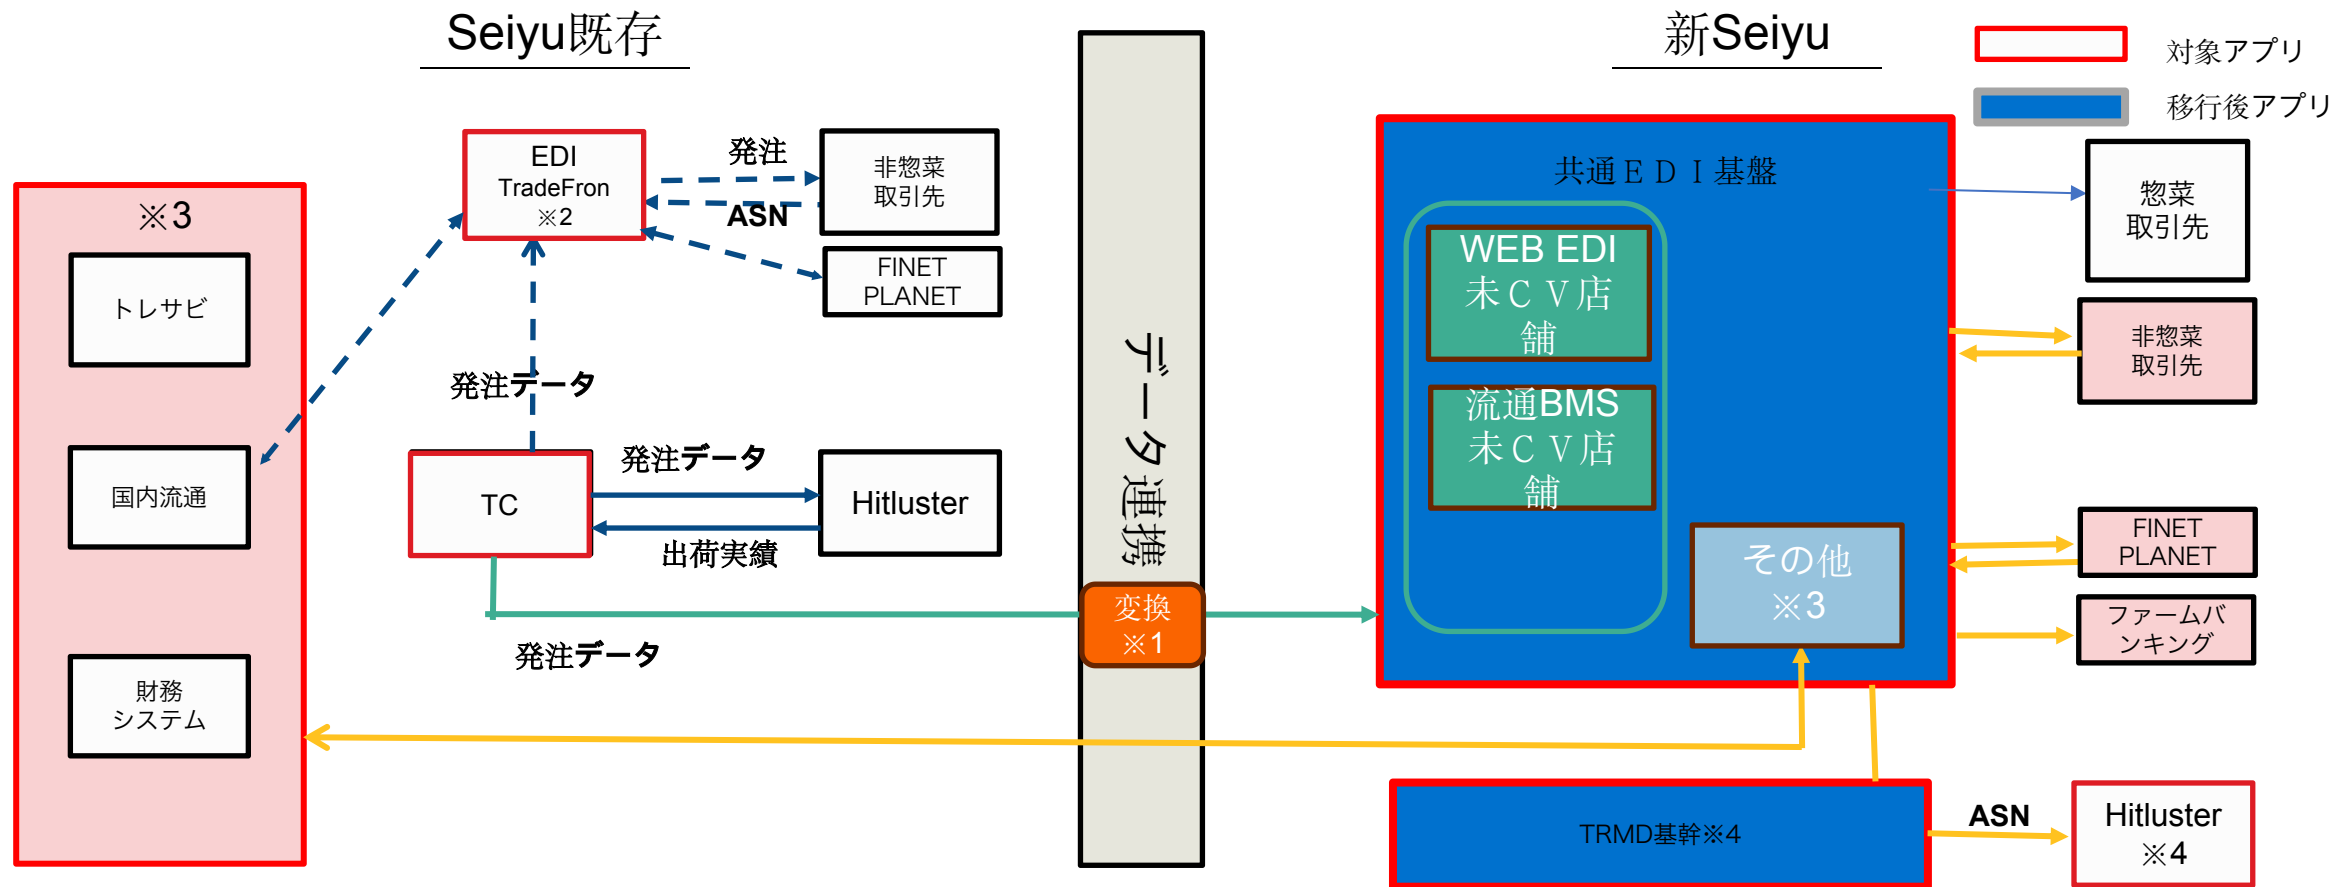

<Memo>

- ・店舗パイロット（2027年5月）前にEDI統合は完了させる
- ※1 TC→DSS→TREDI基盤。マスタなどは変換テーブルを使用し、TR同様のCSVフォーマットに変換の上E D I 連携
- ※2 発注・ASNデータは取引先社数が多いため、コンティンジェンシーフローとして、TradeFrontからもデータ連携可能にする
- ※3 国内流通（SP用）・ファームバンキング・トレサビのデータ連携・切替方法は要検討（EDI経由以外の検討可否）
- ※4 HitlusterへのASNデータ連携はTRMD基幹経由になる（MD基幹統合のWMSデータ連携との依存関係あり）

概要・アプローチ

2.EDI 取引先への切替イメージ（案） + コンティンジェンシープラン

本PJ対象

TR既存
EDIフロー

- EDIの接続先切替は発注日を起点に一齐切替えを行なう。
- EDI切替前には、TRMD基幹とHitlusterのI/F連携がされている

~ 2027/3
EDI切替前

2027/4
EDI切替

2027/5-6
店舗Pilot期間

2027/7-9
全店展開

2027/10-

西友EDI
西友フォーマット

ASN→TRMD基幹→Hitluster

インテック/SCSK
TRフォーマット
(TC連携)

インテック/SCSK
TRフォーマット
(TC連携)

インテック/SCSK
TRフォーマット
(TC/未CV)

インテック/SCSK
TRフォーマット
(CV店舗)

発注日を起点に
一齐切替を想定
(先付発注データ要注意)

FJJ
西友フォーマット
※

インテック/SCSK
TRフォーマット
(店舗Pilot)

インテック/SCSK
TRフォーマット
(CV店舗)



ここまでに
全取引先の
登録・疎通テスト完了必須

※コンティンジェンシーとして、取引先がTRフォーマットで受信できない場合は、西友EDIにて西友フォーマットにて連携することも想定しておく(期間限定・詳細要検討)

2. 店舗CV期間中：非惣菜EDIのMD基幹連携(2027年5-9月)



- 店舗コンバージョン期間は、CV店舗と未CV店舗で伝票番号（PO）は異なるため、取引先は同一商品でもCV/未CV店舗によって伝票番号は分かれてデータ取得となる（取引先説明必須）
- 西友EDI(Trade Front)はシステム停止

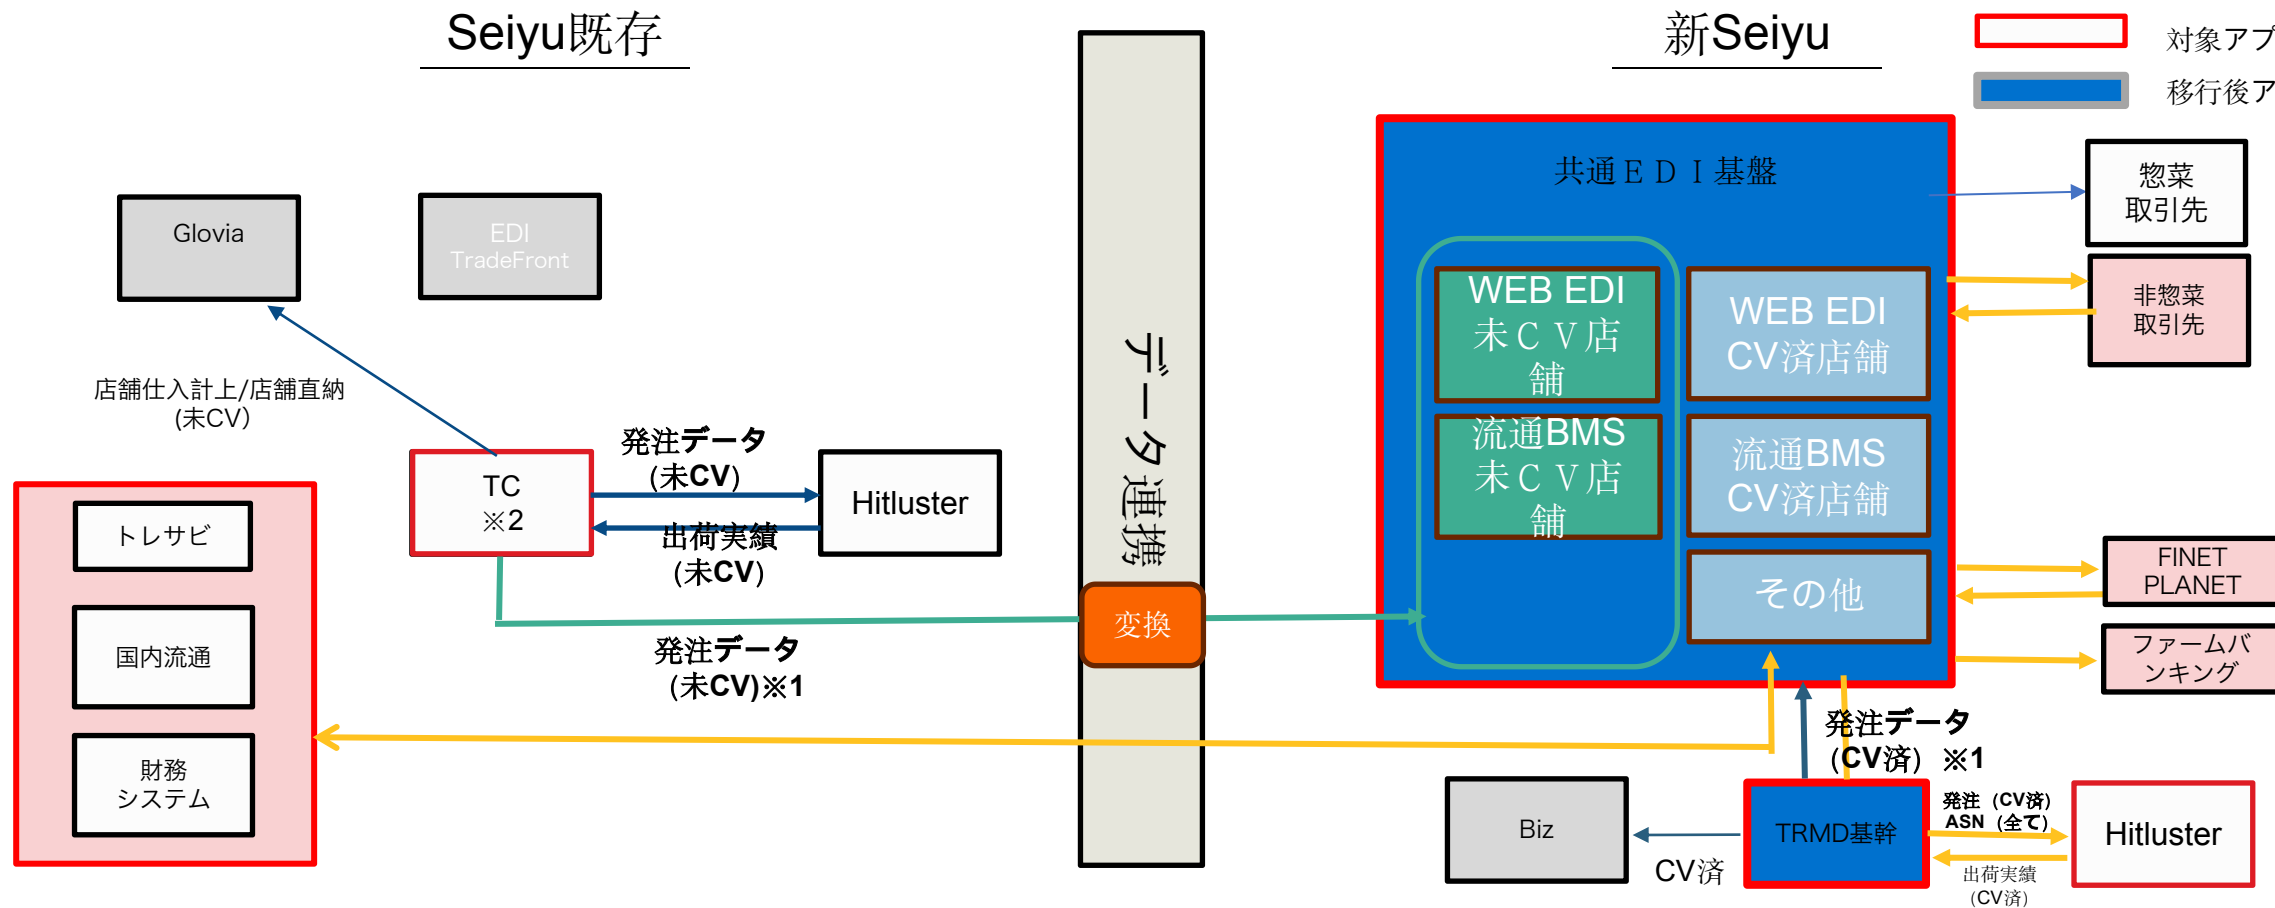



<Memo>

※1 共通EDI基盤では、未CV店舗データ（発注元データがTC）とCV済み店舗データ（発注元データがTRMD基幹）の両方からデータ連携がされる。

※2 伝票番号は、TCとTRMD基幹で重複しないようにする必要あり（TC改修・MD基幹PJ案件）¹⁰

2. 店舗CV完了：非惣菜EDI切替完了(2027年10月)

- 店舗CV完了により、取引先は同一商品・同一仕入先コードの発注は同一伝票番号となる
- 西友MD基幹（TC）からの発注データ連携停止

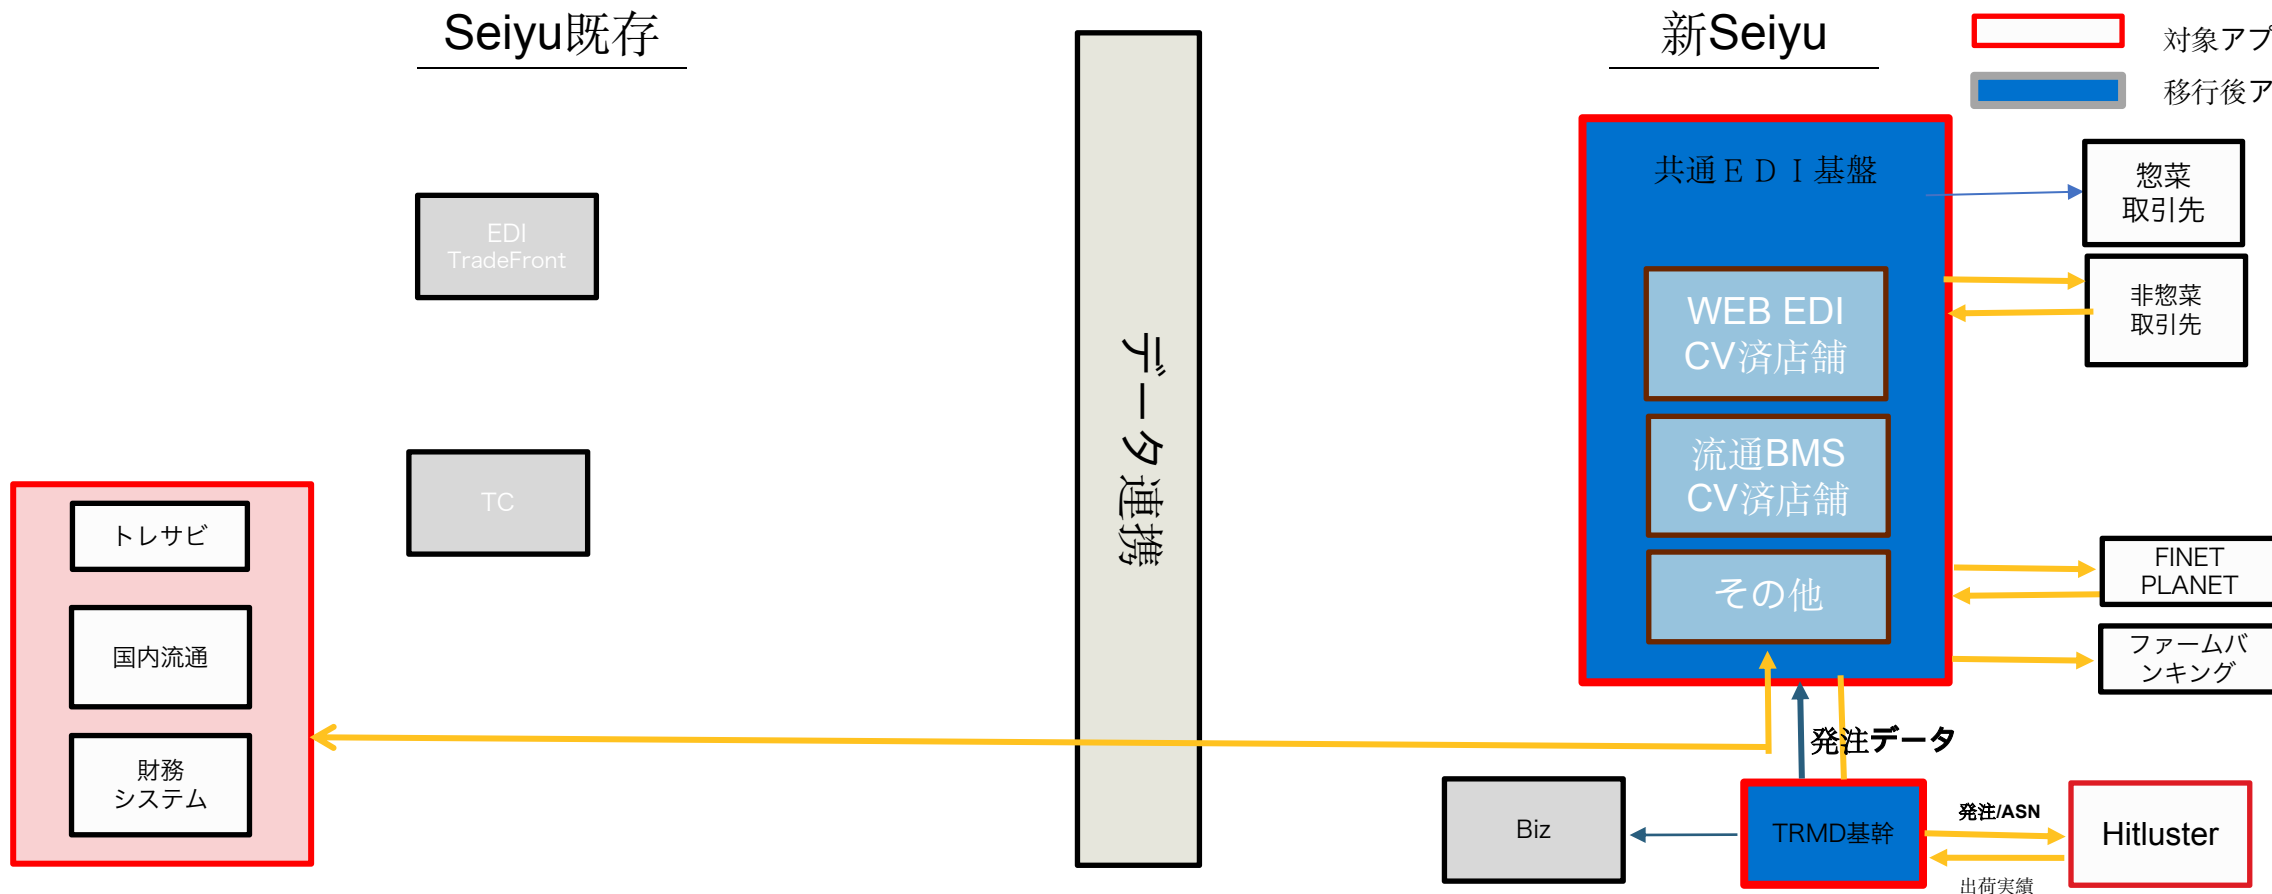

3. スコープ

スコープ 内

- EDI基盤・フォーマット統合
 - ・WEB EDI
 - ・流通BMS（発注・ASN・受領・支払）
- 既存MD基幹連携（過渡期I/F構築）
- 取引先対応（約1360社）
 - ・申請登録、テスト、切替、サポート
 - ・取引先説明会開催

※トライアル取引先への仕入先コード桁数拡張も
 同時にアナウンスするか・別PJにするか確認・検討
- 西友既存システム連携・構築
 - ・トレサビ
 - ・国内流通システム
 - ・財務システム

スコープ 外

- 商品階層統合・仕入先コード9桁拡張・店番統合

4. EDI 登録工数軽減について

検討案

- 流通BMS1,100社については、工数軽減できる方法を検討する

現在、「トライアルにて取引有」のお取引先は、現行の取引先受信コードにコード（9桁仕入先コード）を追加することで疎通テストなどの負荷軽減ができないか検討する。（システム面・取引先面）

※現在、商品部へ取引先の重複確認中

	トライアル取扱いあり	西友扱いのみ	合計
WEB EDI（発注）	コード追加 疎通テスト省略の可能性あり	新規登録・疎通テスト	254社
流通BMS（発注/ASN）	コード追加 疎通テスト省略可の可能性あり	新規登録・疎通テスト （1社登録に3週間）	1,100社
流通BMS（支払）	要確認	新規登録・疎通テスト	要確認

5. スケジュール


- TR EDI取引先への9桁対応が完了は5月以降、西友・トライアル統一フォーマットで受領することになるため必要
- 商品マスタ統合完了は、EDI切替時にはTo-Beのトライアルの商品階層にて取引先へ連携するため、商品マスタ統合は必要
- MD基幹データ連携完了は取引先からのASNデータはCV済み・未CV関係なく、TRMD基幹よりWMSへ全データ連携するために必要

ベンダー主体

システム主体

ビジネス主体

クリティカルパス

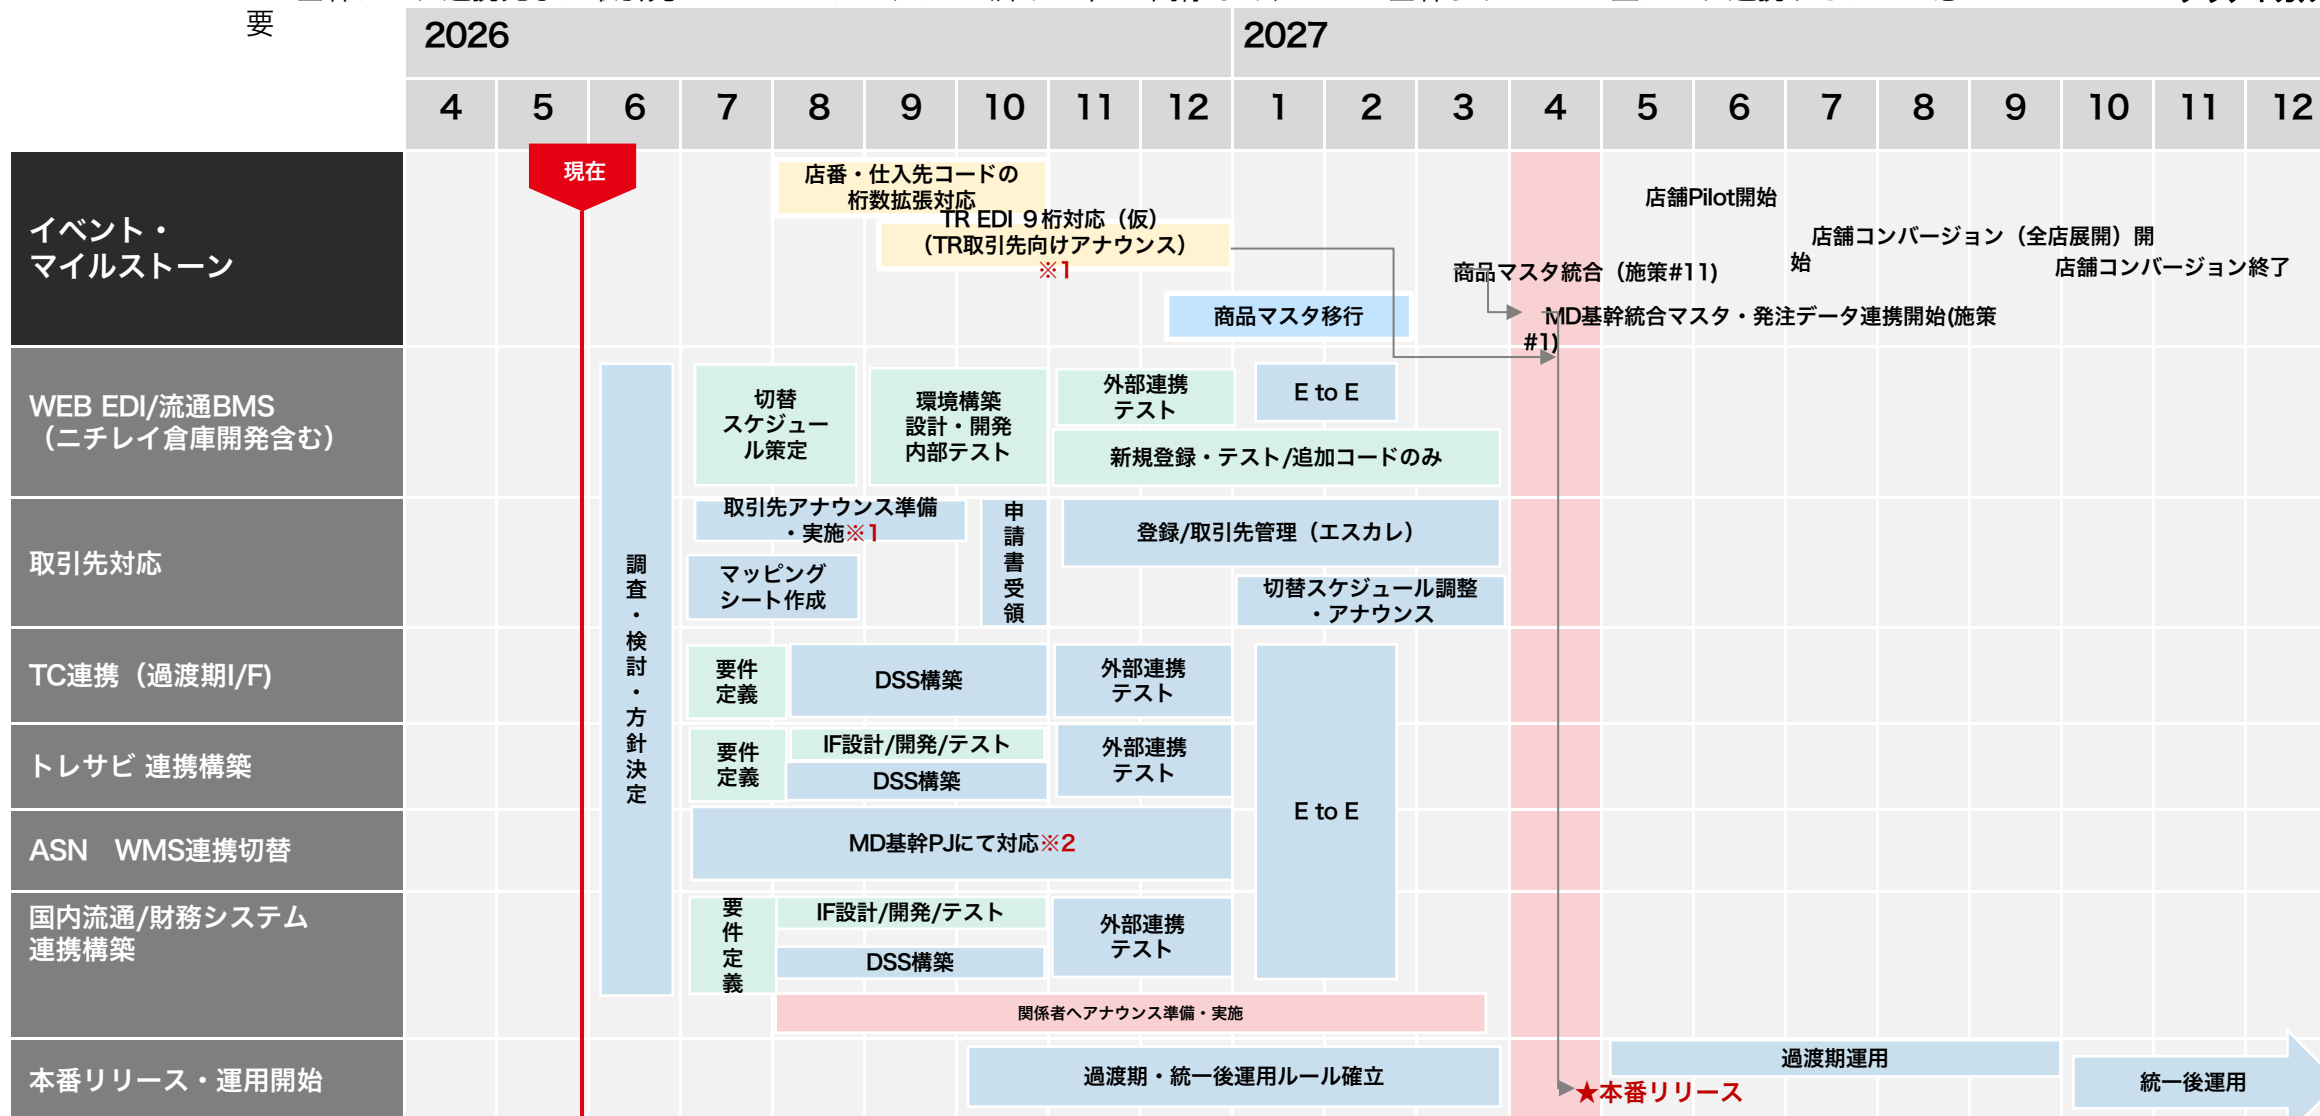

予算計上時には、EDI統合が2027年6月リリース想定
店舗パイロット(5月) により2027年4月切替により48期のコストは変動（減額）する
可能性大


6. コスト（単位：百万円）

費目				予算				備考
				CAPEX	OPEX 48期	OPEX 49期	合計	
一過性経費		外部ベンダー費用	要件定義・環境構築・導入	—	49.5	-	49.5	予算計上時はSCSK社にて試算（減額の可能性あり）
		TRE費用	CSVフォーマット変換 データ連携構築など	—	7.8	-	7.8	予算計上時は内容不明の中、工数確保のみ
		周辺システム	疎通テスト・データ検証		TBD		TBD	予算計上なし 保守内での検討確認
		一過性経費合計		57.3		57.3		
ランニング	既存保守	年額	TradeFront(富士通)		91	18	109	予算上49期に費用を若干計上しているが不要な可能性大 月額8百万円→3百万円
	新規保守	年額	外部ベンダー		5	60	65	予算計上時はSCSK社にて試算 月額5百万円
		ランニングコスト計			96	78	174	
合計								

7. 体制・役割

下線はリード

- プロジェクト実行の責任者
- プロジェクト全体方針の立案・実行
- プロジェクト全体の進捗管理進捗・課題／リスク・コスト等のモニタリング
- ステークホルダーへのレポーティング・コミュニケーション
- チーム横断的な課題の解決支援

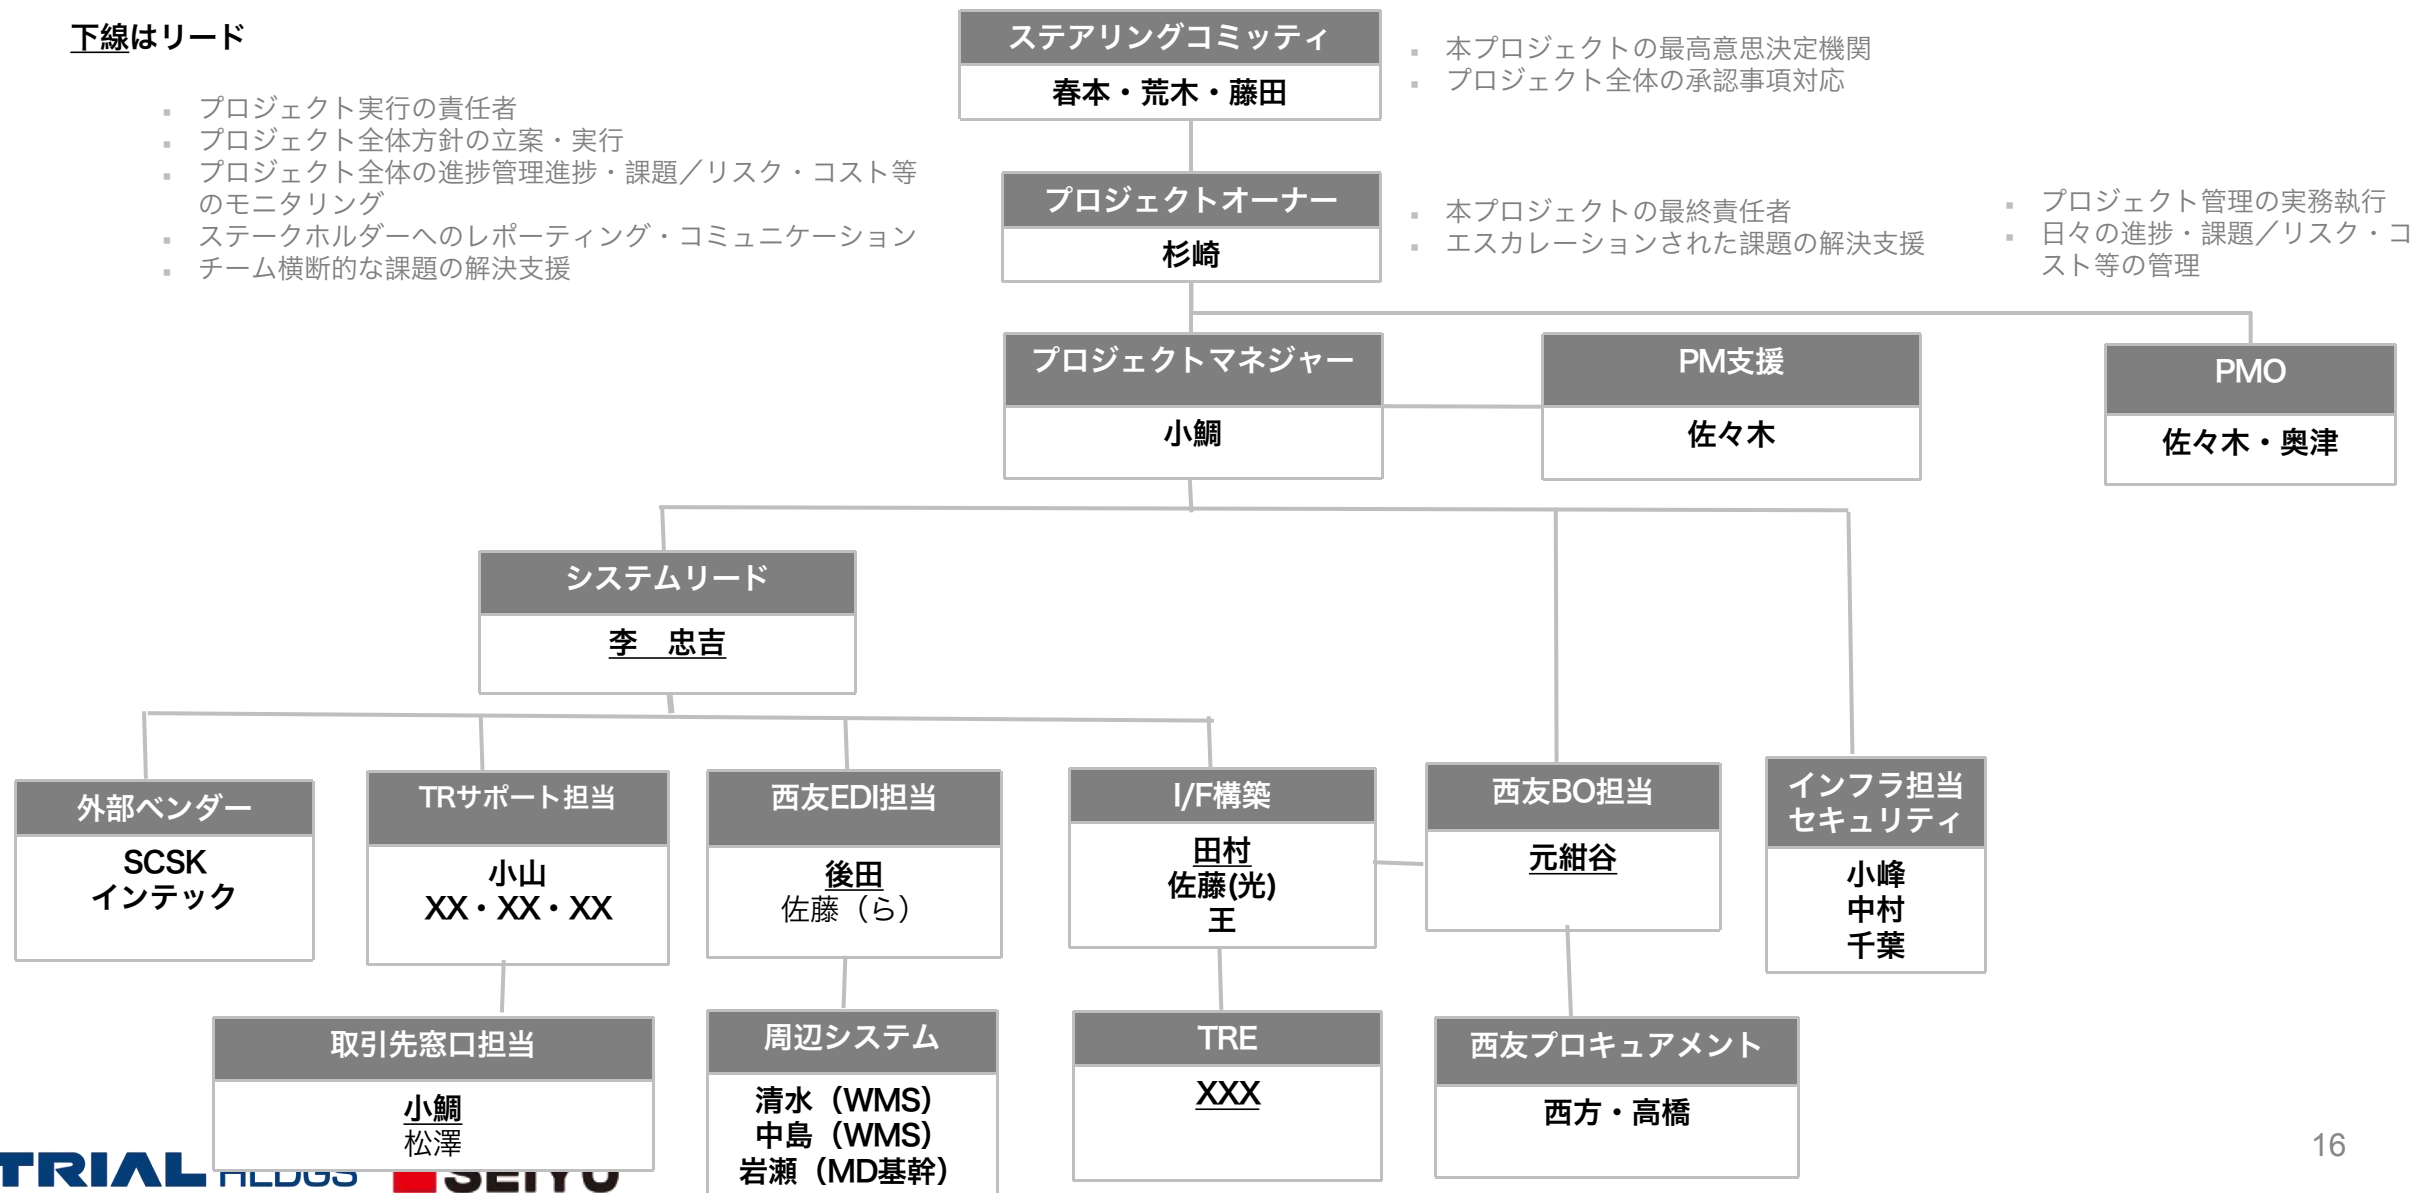

7. 役割一覧

プロジェクト推進体制および各領域の役割・責任範囲

区分	役割	内容	担当者
意思決定層	ステアリングコミッテ ィ	- プロジェクト全体の意思決定 - 重要方針・投資判断の承認 - 重大課題の最終判断	春本 荒木・藤田
意思決定層	プロジェクトオーナー	- プロジェクトの最終責任 - 全体方針の決定 - エスカレーション対応	杉崎
全体統括	プロジェクトマネー ジャー (PM)	- 全体計画の策定・推進 - 進捗／課題／リスク管理 - 各領域間の横断調整	小鯛 TBH
全体統括	PM支援	- PMの実務支援（進捗管理・課題管理） - ストア・BO案件のPM - 会議運営／資料作成	佐々木
全体統括	PMO	- プロジェクト管理プロセスの標準化 - 進捗・品質・課題の可視化 - 各種レポーティング	佐々木 奥津
発注関係	システムリード	- EDI連携の技術責任 - システム仕様の統制・方針提示 - TR EDI基盤への移行管理	李忠吉
発注関係 他	外部ベンダー	- EDI切替策定 - 要件定義・開発・テストの実行 - 技術支援 - 成果物作成	SCSK インテック
発注関係	TRサポート担当	- EDI運用ルール確立 - 取引先対応支援	小山 派遣
取引先	取引先窓口担当	- 取引先案内文書作成 - 取引先アナウンス - 取引先問い合わせ対応	小鯛 松澤

区分	役割	内容	担当者
MDSCM 領域	西友EDI担当 (トレサビ含む)	- システム要件整理（現行仕様の説明） - 外部結合テスト計画 - E2Eテスト計画	後田 佐藤（ら）
MDSCM 領域	周辺システム担当	- ASNのWMS、MD基幹（TRMD基幹）についてMD基幹PJとの進捗状況とのすり合わせ - 過渡期TCデータ連携時の要件確認	清水 中島 岩瀬
MDSCM 領域	I/F構築チーム	- インフラ基盤の設計・運用 - 環境構築・運用管理 - I/F構築（TREまたは内製）	田村・佐藤(光) 王・TRE
BO領域	西友BO担当	- 国内流通、財務システムの要件定義・調整 - 外部結合テスト計画 - E2Eテスト計画 - I/F構築（TREまたは内製）	元紺谷
BO業務領 域	西友プロキュアメント	- 国内流通システムの要件定義 - SP取引先対応 - 外部結合テスト参画	西方 高橋
横断領域	インフラ／セキュリティ	- インフラ基盤の設計・運用 - セキュリティ要件の管理 - 環境構築・運用管理	小峰 中村 千葉

8. 会議体

会議	サイクル	日時	主催	目的・アジェンダ	参加者 (L=主催、R=必須、O=任意)								備考
					ステコミ メンバー	プロジェ クト オーナー	PM	PMO	チーム リード	担当 メンバー	サブ チーム リード	サブ チームメ ンバー	
ステアリング コミッティー	月次	都度調整	PM	- 重要方針・投資判断の承認 - 重大課題の最終判断	R	R	L	R	R	R	O		
プロジェクト全体 週次定例会議	週次	毎週XX HH-HH	PM	- 全体進捗・課題・リスクの共有 - 各領域の状況報告 - 意思決定事項の整理		R	L	R	R	R	R	O	
チーム 週次進捗会議	週次	毎週XX HH-HH	システム リード	- 各領域の進捗管理 - 業務・システム課題の整理					L	R	R	R	
個別課題対応ミーテ ィング（ワーキン グ）	適宜	毎週XX HH-HH	各担当 者	個別課題の検討・対応						L	R	R	

9. 課題・リスク

#	区分	タイトル	内容	優先度	状況	担当	期限	対応方針・進捗・次のステップ
1	リスク	取引先対応	流通BMS1100社の切替方針の検討 全て新規登録を実施するとかなりの期間を要する可能性あり 取引先側の対応遅れなど	H	対応中	後田	5/末	■ トライアルと重複している取引先を特定 ■ 重複取引先は受信コードを同じにし、コード追加での対応を検討
2	リスク	依存関係	商品マスタ統合・MD基幹統合のリリースがクリティカルパスになるため、各プロジェクトの遅延によるスケジュール遅延の可能性あり	M	未対応	杉崎 佐々木	5/末	■ MDSCM領域PMへのEDI切替のステップの周知 ■ MDSCM全体PJのスケジュール管理の構築
3	リスク	XXX	XXXXXX	L	対応中	XXX	MM/DD	■ XXX ■ XXX
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								


10. 直近アクションアイテム

#	アクションアイテム	関連するタスク	状況	担当	起票	期限	進捗・備考
1	トライアルとの重複取引先調査	XXX	対応中	後田	5/18	5/末	- 商品部へ確認 - EDI登録リストより突合せ
2	ベンダー見積受領	XXX	対応中	後田	5/18	6月中旬	- SCSK・インテックへ要件説明・見積依頼 - インテックへ追加要件（ニチレイ）共有 #1の結果共有（インテック）
3	TRメンバーアサイン システムリード・TRサポート担当	XXX	対応	杉崎	5/18	5/22	春本さんへ依頼中
4	システムチームMTG開催	XXX	未対応	佐々木 奥津	5/18	6/月上旬	- TR/SY MDSCM・BO関係者とのMTG - 今後の進め方の確認
5	トライアル仕入先コード9桁対応のアナウンスについて	XXX	未対応	杉崎	5/19	6月中	- トライアルメンバーと確認 - 方針決定
6							
7							
8							
9							
10							

参考資料

買い物を楽しく、暮らしを豊かに。
TRIAL ■ SEIYU

STAND TOGETHER



2. 概要・アプローチ To-Beフロー（案3：SCSKへすべて移行）

- ▶ トライアルではWEB EDIはスマクラ、流通BMSはインテックであるが、すべてSCSKにて開発していく
- ▶ 西友では流通BMSの取引先数がトライアルの3.6倍のため、今後のEDI運用をSCSKに統合

設定追加のみ

新規開発

送信受信先

生鮮取引先
260社

取引先
1100社

ニチレイ倉庫

外部畜産PC取引先

Hitluster/Datalake

※WMSへの
ASNはMD基
幹より連携

国内流通

PLANET

FINET

金融機関（銀行）

システム

トライアル
MD基幹

発注関係



SCSK
(EDI)

スマクラ
for web

発注→
←入荷予定確定
(ASN)

発注・集計表→
←ASN
受領→
支払→

発注・集計表→

発注・集計表→

←トレサビ

流通BMS

I-Master
eB-MDM

トレサビ

トレサビ



西友プロキ
ュアメント
SP用

集計表発注→
受領→
支払→

発注→

発注→

←仕入
←請求鑑
←請求照合

→総合振込
←入出金取引明細

国内流通
システム

SP用発注関係



財務システム

銀行関係




FB用

全銀



※値札についてはトライアル運用では発注データをもとにラベル作成をされる運用のため、運用統合想定

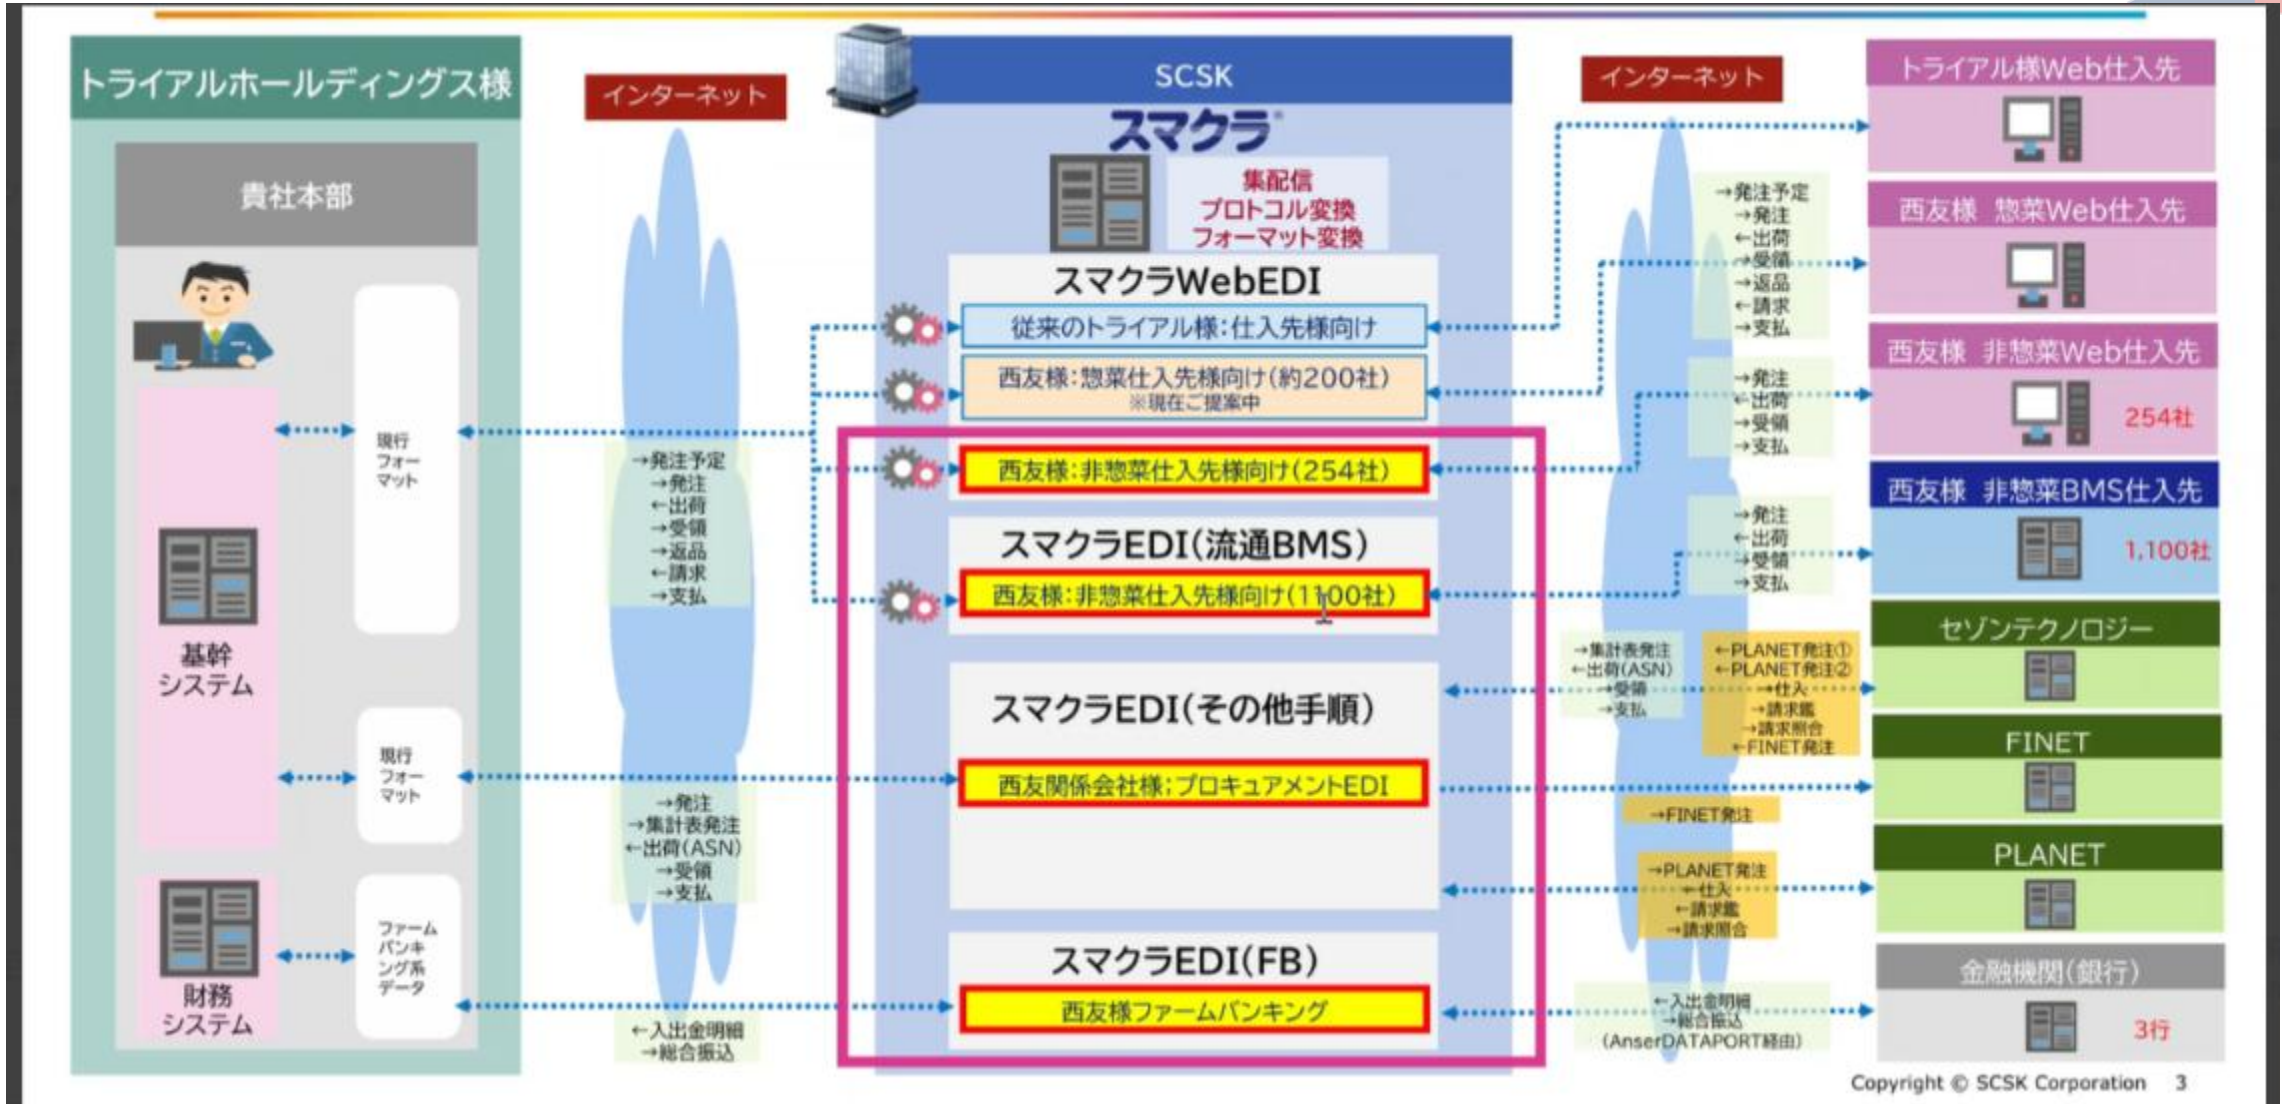

プロジェクトダッシュボード【XXチーム】

前週からの変更点は赤字で記載


概況 ハイライト - XXX - XXX - XXX - XXX	
---	--

プロジェクト		RAG	概況・課題等コメント	
##	XXX	G	- XXX - XXX	
##	XXX	A	- XXX - XXX	
##	XXX	R	- XXX - XXX	
##	XXX	G	- XXX - XXX	
##	XXX	A	- XXX - XXX	
##	XXX	G	- XXX - XXX	
##	XXX	G	- XXX - XXX	

週次報告フォーマットサンプル


チーム		状況	先週の進捗・達成事項	今週の予定	課題等
A	XXX	G	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX
B	XXX	A	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX
C	XXX	R	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX
D	XXX	G	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX
E	XXX	G	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX	▪ XXX ▪ XXX ▪ XXX

ステコミ報告フォーマットサンプル

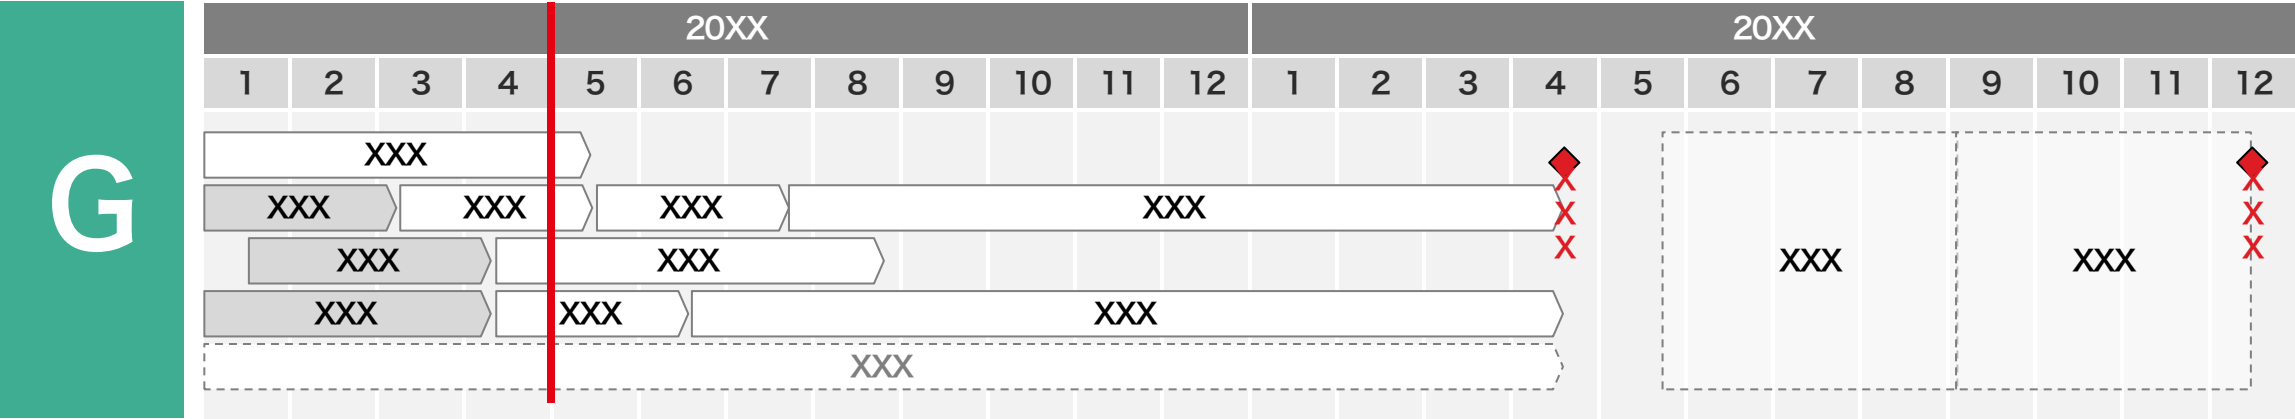

全体概況	- XXX - XXX - XXX
コスト	- XXX - XXX - XXX
スケジュール	- XXX - XXX - XXX
課題・リスク	- XXX - XXX - XXX


予算費消状況報告サンプル（単位：百万円）

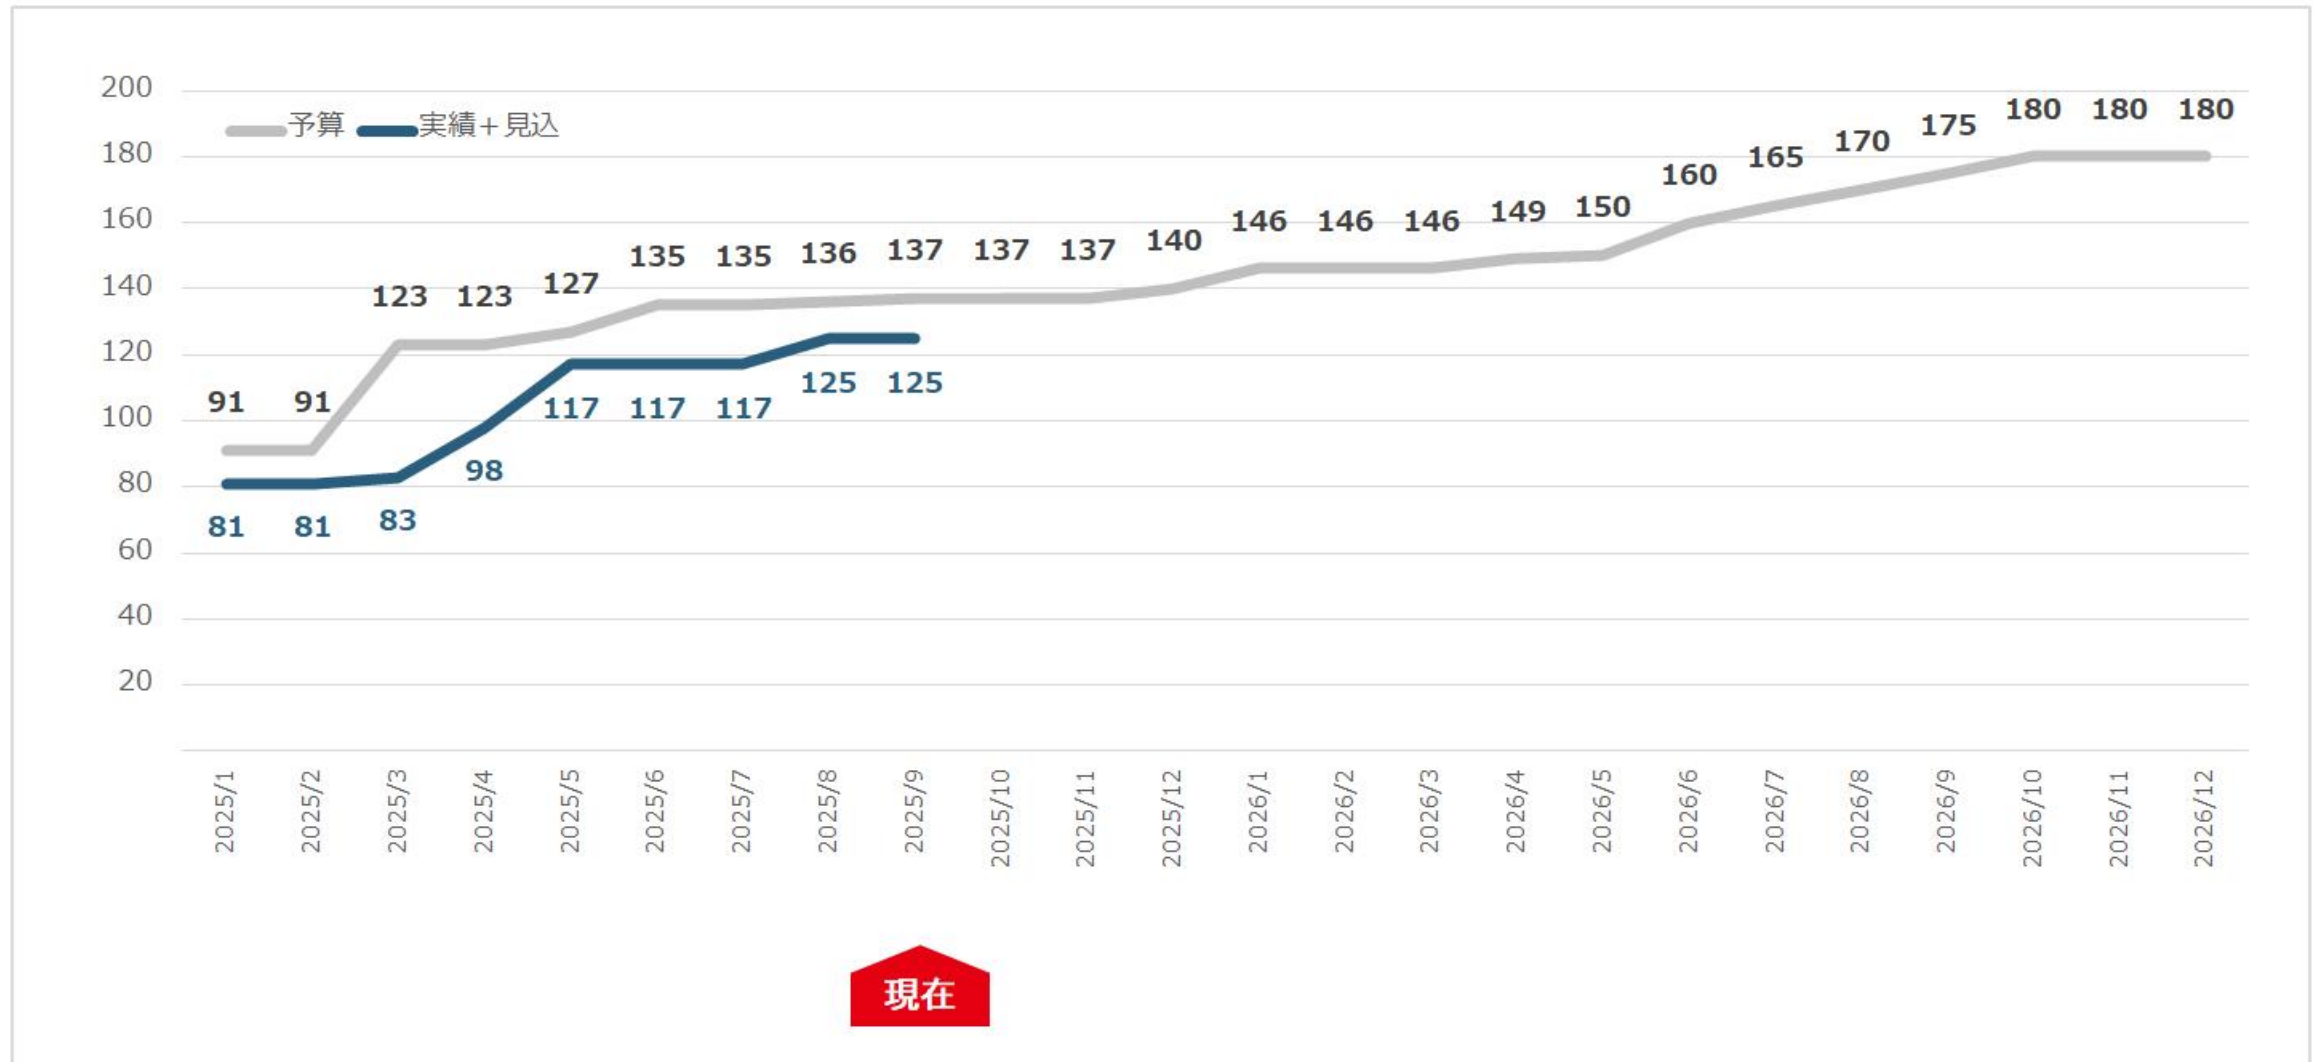


買い物を楽しく、暮らしを豊かに。

TRIAL ■ **SEIYU**


STAND TOGETHER



4. Phase1 :スケジュール 組織統合（7月）以降の運営体制/データ移行準備

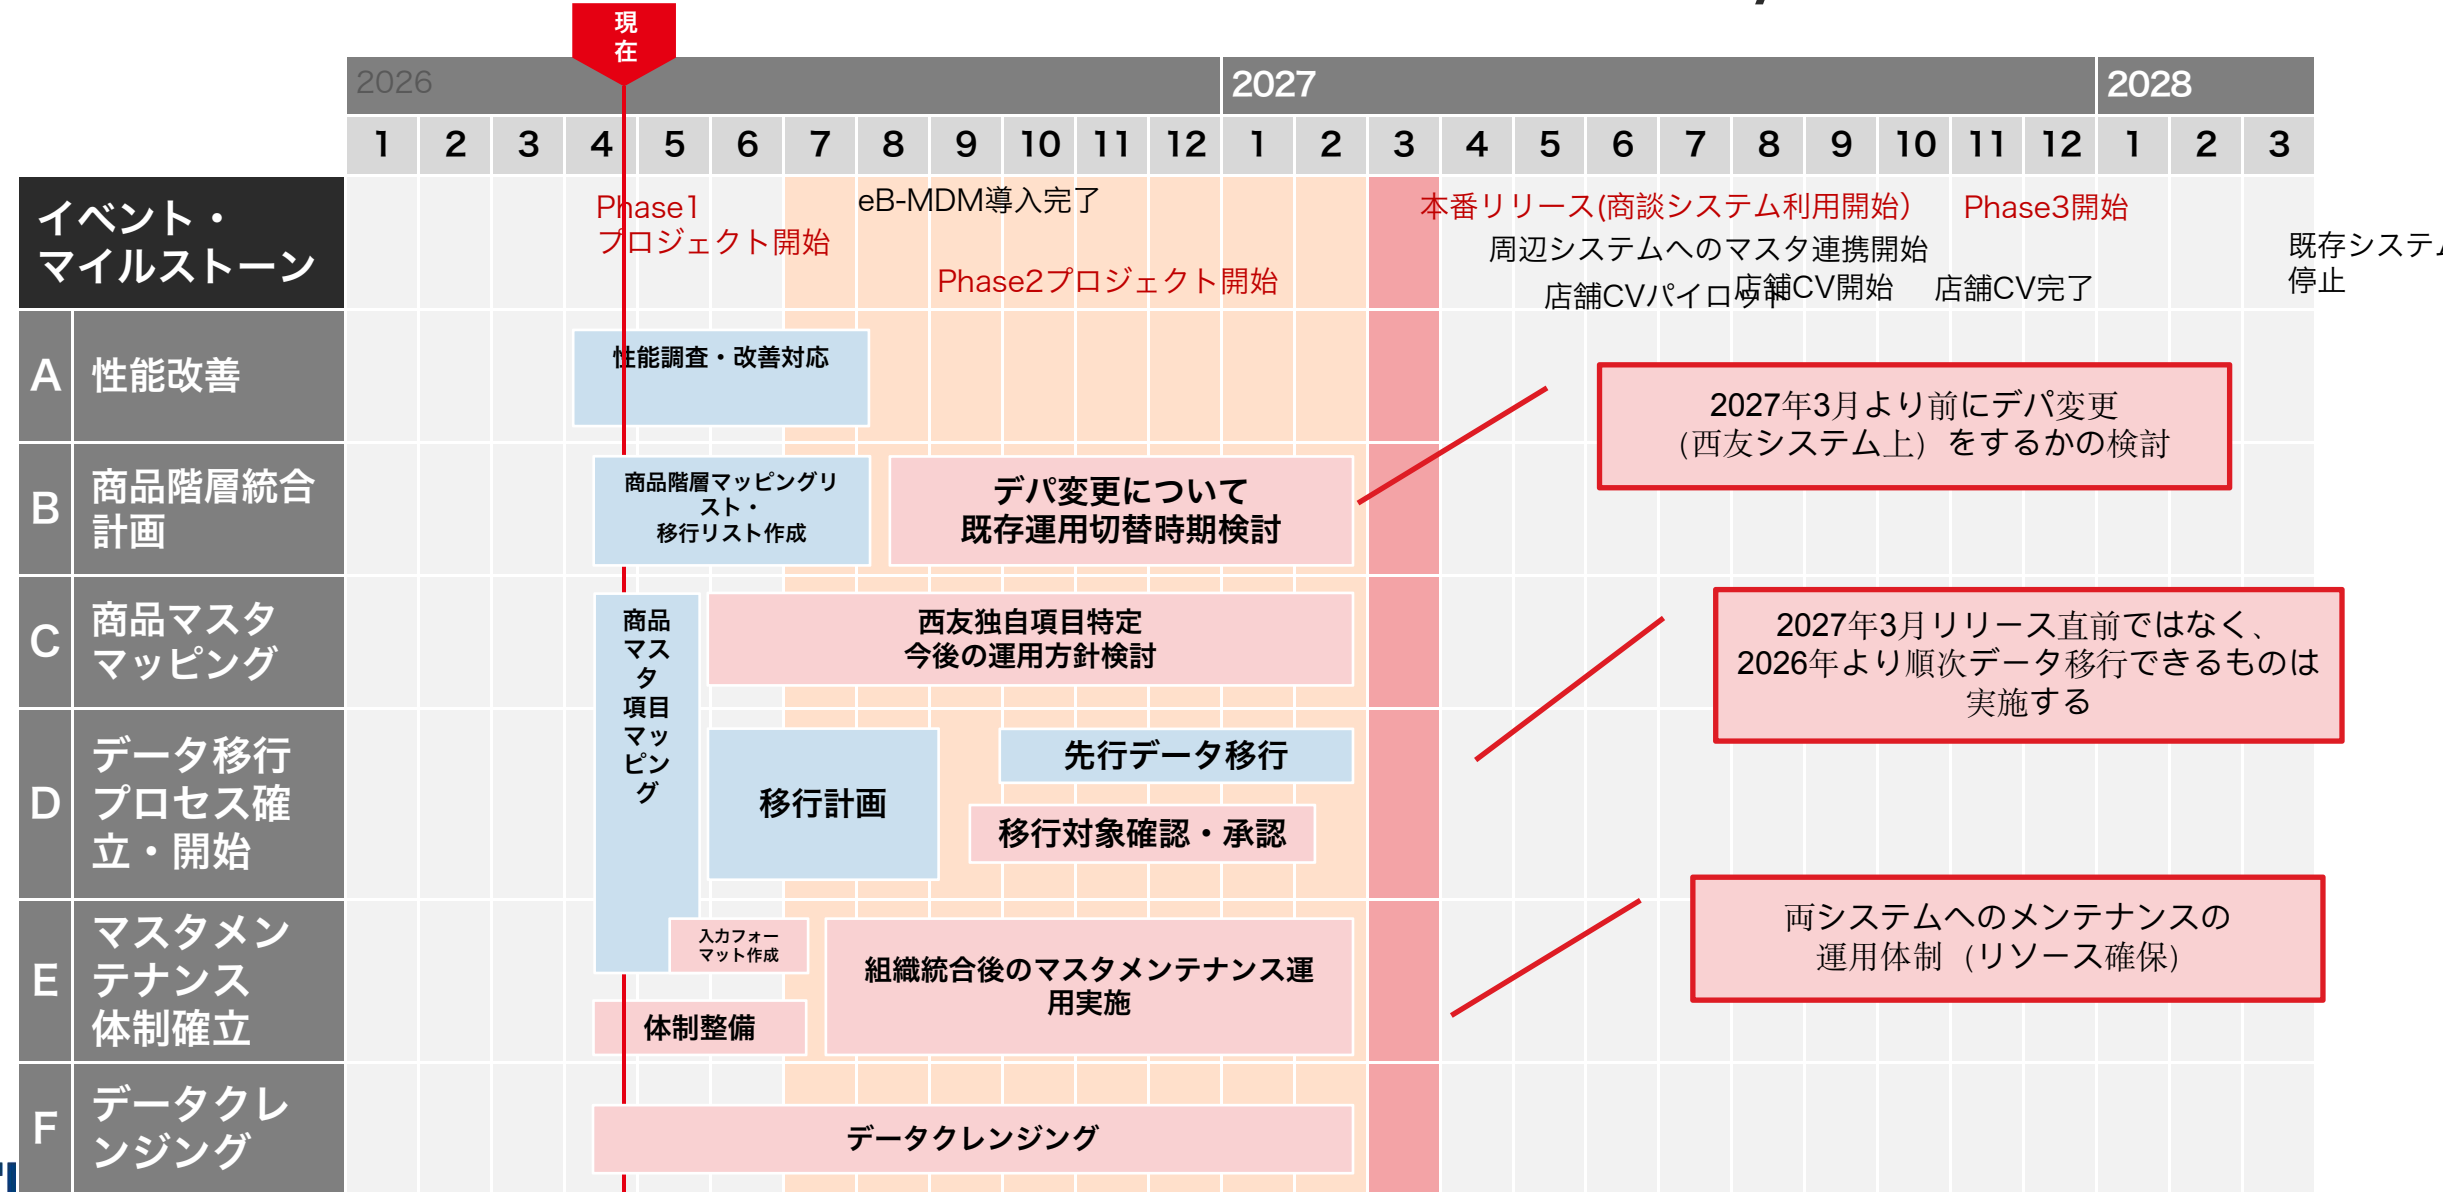

4. Phase2-3:スケジュール 商談システム本番リリース

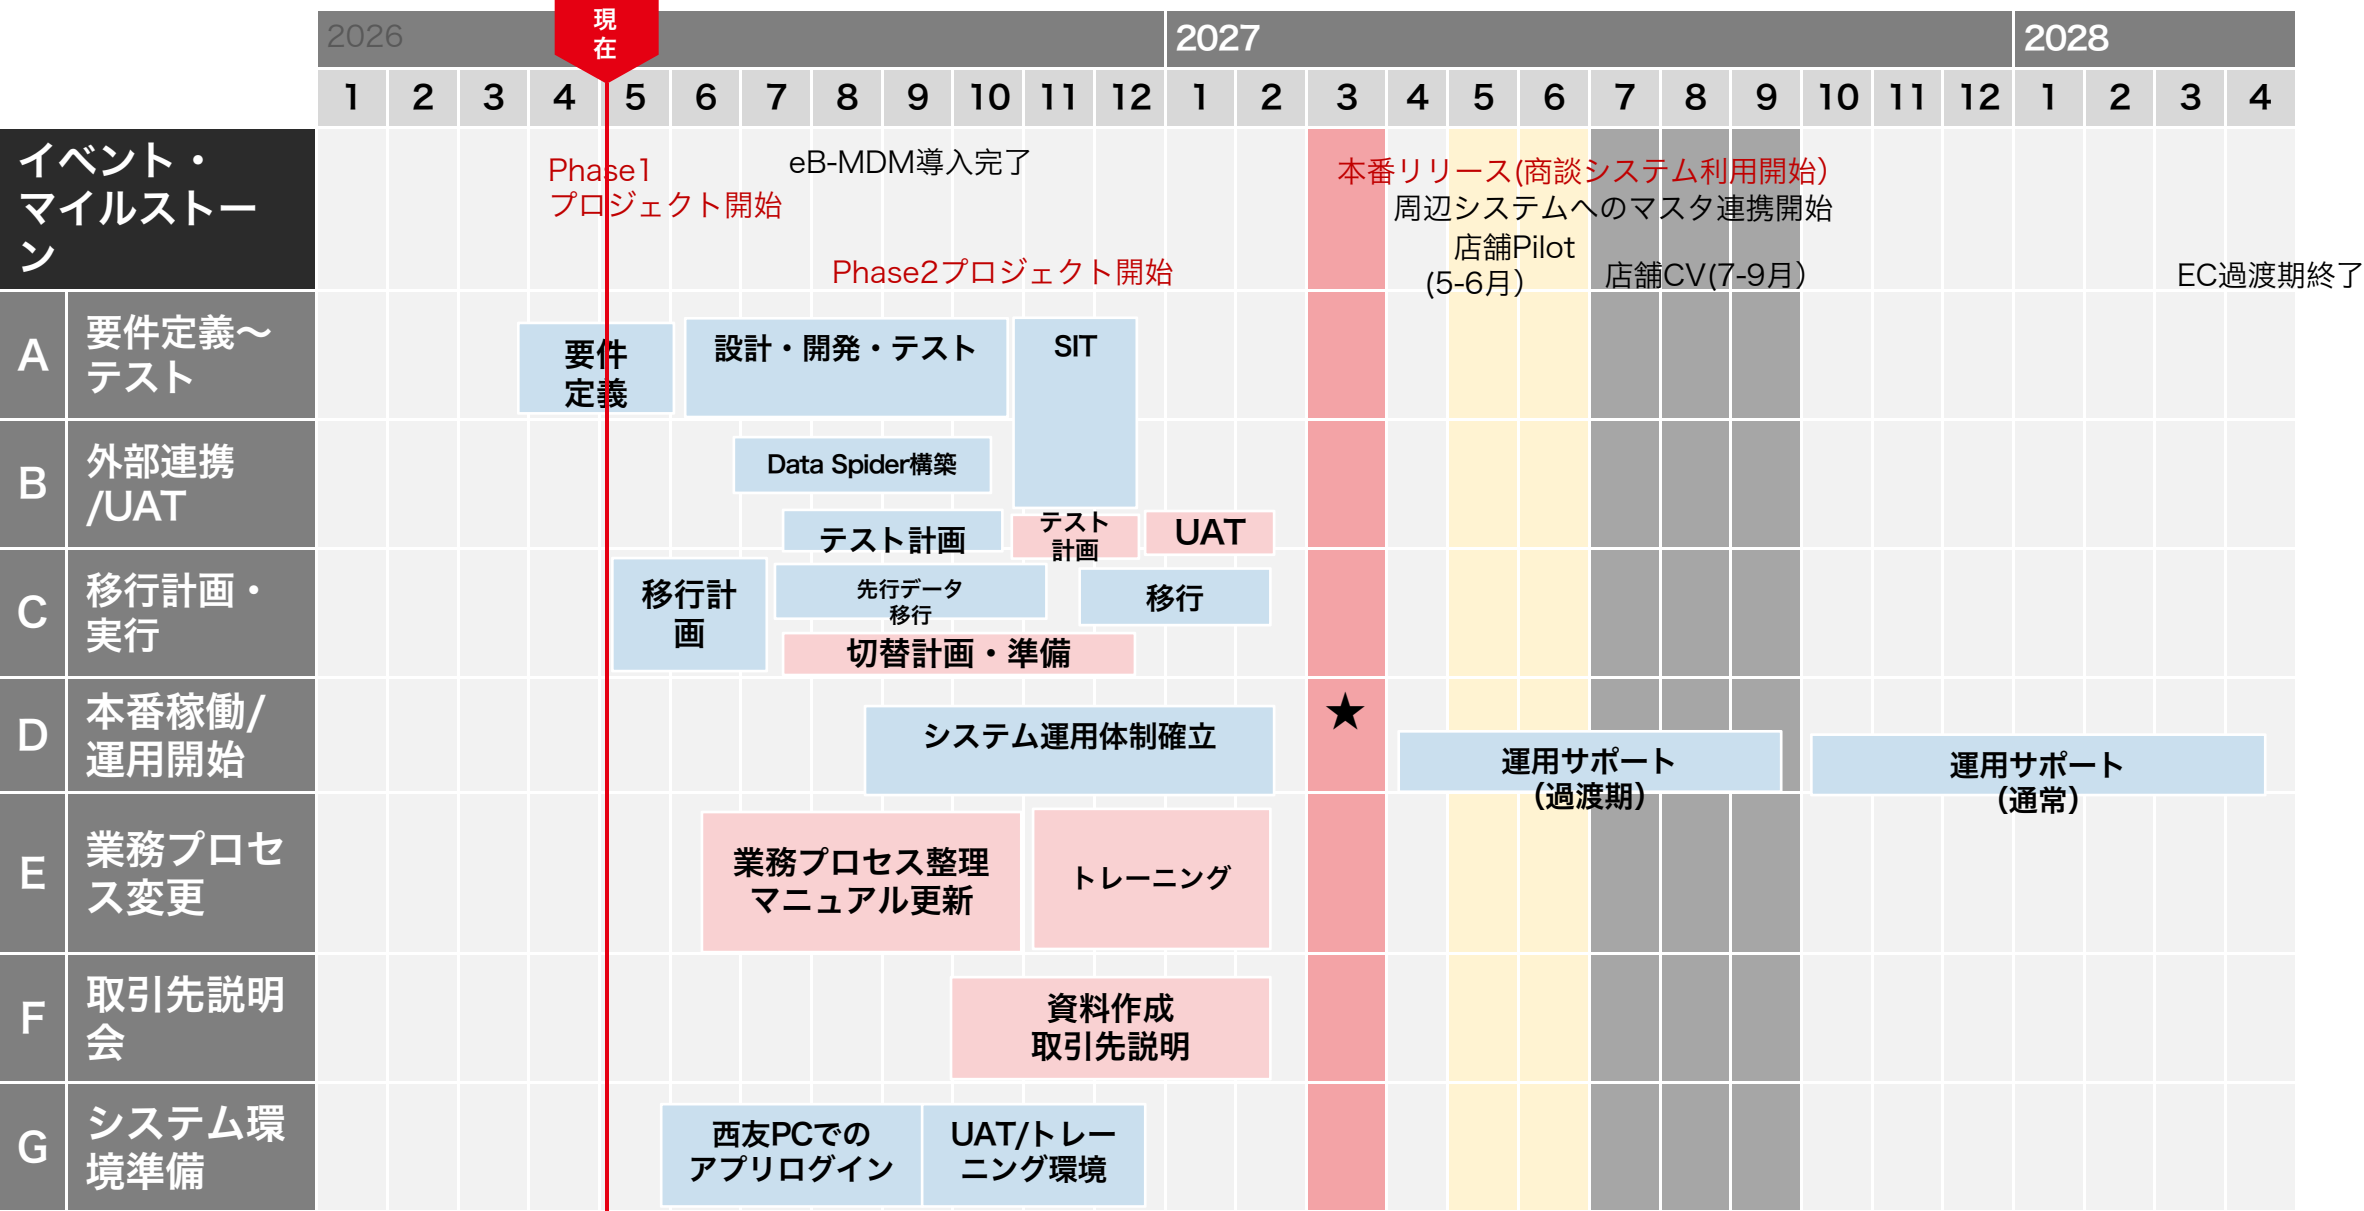

#1 MD基幹システム統合

システム主体

ビジネス主体

マスタ連携および業務I/Fを先行して整備し、その後の統合テストを経て店舗コンバージョンへ移行する。

